

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

**YATIRIM PROGRAMI
İZLEME**

VE

**DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Şubat 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



İÇİNDEKİLER

I - ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	4
II – GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1- Misyon	5
2.2- Vizyon	5
2.3- Finansman Kaynakları	5
2.4- Temel Amaç ve Hedefler	7
2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi	8
2.6- Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler	14
2.7- Yılı Yatırım Hedefleri	21
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	21
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	22
III- <u>YILI YATIRIM PROGRAMLARI</u>	23
IV- ÖNERİLER	40
V - EKLER	40
Siirt Üniversitesi Yılı Yatırım Projeleri Listesi	41
Siirt Üniversitesi Yılı Kamu Yatırımları Özeti	42
Siirt Üniversitesi Yerleşkesi Vaziyet Planı	43

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde idarelere, çeşitli raporların hazırlanması ve harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır.

Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. 5018 sayılı Kanun'un 25'inci maddesinde, yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Üniversitemizin yılı yatırım bütçe ödenekleri ve yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiş olup, ihaleleri tamamlanarak yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ve denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı faaliyetlerine devam edilerek, büyük bakım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Birimlerin makine, teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Murat ERMAN
Rektör

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

I I – GENEL DEĞERLENDİRME

2.1- Misyon

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

2.2- Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir üniversite olmak.

2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46'ıncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim

kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı



kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (sosyal tesis, kantin, kafeterya işletme) Gelirleri
 - 3) Öğrenci Harç Gelirleri
 - 4) Devletçe Karşılanaan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

B)Döner Sermaye Gelirleri

C)Bütçe Dışı Kaynak ve Proje Destekleri

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Hibe
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar

Üniversitemizin yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplam 21.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 18.759.000,00 TL ekleme, 120.000,00 TL düşme işlemi yapılarak yılı toplam ödeneği 39.639.000,00 TL olmuş ve bu ödeneğin 32.228.668,85 TL'si harcanmıştır.

Üniversitemiz Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

EKO.KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	ORAN
06.1	Mamul Mal Alımları	3.550.000,00	414.000,00	120.000,00	3.844.000,00	2.455.127,96	63,87
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000,00	120.000,00		220.000,00	215.530,64	97,97
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.750.000,00	18.150.000,00		34.900.000,00	29.075.678,55	83,31
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	600.000,00	75.000,00		675.000,00	482.291,70	71,45
GENEL TOPLAM		21.000.000,00	18.759.000,00	120.000,00	39.639.000,00	32.228.628,85	81,31

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.4-Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Amaç-2 EĞİTİMİN ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi HEDEF 2. 2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması
Amaç-3 İNSAN KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi
Amaç-4 BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTIRILMASI	HEDEF 4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF 4.2. Yayınların artırılması HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması.
Amaç-5 FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin arttırılması HEDEF 5. 2. Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını devam ettirmektedir. 2013 yıl sonu itibarıyla Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere yedi fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere üç enstitü, Siirt Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 adet yüksekokul bulunmaktadır.

Üniversitemizin şehir merkezi kampüs alanı 25.512,22 m²'dir. Burada, Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Enstitüler ile 35 daireli lojmanlar bulunmaktadır. Ayrı bir yerleşkede hizmet veren Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu alanı da 9.040,00 m²'dir. Kezer kampüs alanında ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 1000 seyirci kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Konukevi, 100 Daireli Lojman ve Rektörlük Konutu, Kapalı Spor Salonu ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binaları tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Eğitim Fakültesi, Rektörlük Binası, Merkezi Kafeterya, Merkezi Kütüphane Binası, Sağlık Merkezi ve 2'nci etap altyapı çalışmalarına ait imalat ve inşaatları devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Kongre Merkezi binaları için proje teklif ve ihaleye çıkma hazırlıkları devam etmektedir.

Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibarıyla Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine/Diğer	
Merkez Kampüs Alanı		25.512,22	25.512,22
Pınarca Köyü Kampüs Alanı	657.919,11	1.568.221,72	2.226.140,83
Eruh Meslek Yüksekokulu		45.903,53	45.903,53
Kurtalan Meslek Yüksekokulu		4.816,00	4.816,00
Sağlık Yüksekokulu		9.040,00	9.040,00
Toplam	657.919,11	1.653.493,47	2.311.412,58

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz Personel Durumu aşağıda gösterilmiştir.

AKADEMİK PERSONEL	SAYISI
Profesör(7'si görevlendirme, 1'i Yabancı Uyruklu Sözleşmeli)	16
Doçent (1'i Görevlendirme, 1'i Yabancı Uyruklu Sözleşmeli)	19
Yrd.Doç.(2'si Görevlendirme)	92
Öğretim Görevlisi(6'sı Yabancı Uyruklu Sözleşmeli)	94
Okutman	16
Araştırma Görevlisi	139
Uzman	9
T O P L A M	385

İDARİ PERSONEL	SAYISI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	196
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	9
Teknik Hizmetler Sınıfı	38
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	9
T O P L A M	252

Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar				
	2011	2012	2013	2014
Kapalı Alanların m ² si	21.435	43.466	64.574	127.031
Öğrenci Sayısı (Toplam Öğrenci)	4.589	5.145	6.023	8.117
Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanların m ² si (Kapalı Alan m ² 'si/ Öğrenci Sayısı)	4,67	8,45	10,72	15,65

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m ²)								
Birim Adı	Eğitim Öğretim ve Araştırma	Sağlık	Barınma (Lojman)	Beslenme	Kültür	Spor	İdari ve Diğer	TOPLAM (m ²)
Merkez Kampüs	1.992	97	4.650	1.575	1.309	-	6.844	16.467
Sağlık Y.O.	746	24	-	108	-	422	1.780	3.080
Eruh MYO	409	-	1.023	383	-	-	1.083	2.898
Kurtalan MYO	380	-	-	-	-	-	538	918
Kezer Kampüsü	32.218	1.000	22.285	12.250	6.500	3.368	26.047	103.668
TOPLAM	35.745	1.121	27.958	14.316	7.809	3.790	36.292	127.031

Kapalı Alanların Dağılımı				
Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m ²)			TOPLAM (m ²)
	Üniversite	Maliye Hazine	Diğer	
Şehir Kampüsü	-	16.467	-	16.467
Sağlık M.Y.O.	-	3.080	-	3.080
Eruh M.Y.O.	-	2.898	-	2.898
Kurtalan M.Y.O.	-	918	-	918
Kezer Kampüsü	30.874	72.794		103.668
TOPLAM	30.874	96.157	-	127.031 m ²

Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar				
	2011	2012	2013	2014
Taşınmaz Alanların m ² si	2.311.412,58	2.311.412,58	2.311.412,58	2.311.412,58
Öğrenci Sayısı	4.589	5.145	6.023	8.117
Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların m ² 'si (Taşınmaz Alanların m ² 'si/Öğrenci Sayısı)	503,68	449,25	383,76	284,76



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yıllara Göre Değişen Öğrenci Sayıları

FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
EĞİTİM FAKÜLTESİ	1471	1487	1719	2043	2054	2101	1970
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	60	163	252	288	118	265	349
MÜH. MİM. FAKÜLTESİ	-	40	83	112	74	210	320
ZİRAAT FAKÜLTESİ	-	-	-	-	-	26	46
İLAHİYAT FAKÜLTESİ	-	-	-	-	-	205	448
İİBF	-	-	-	-	-	188	347
VETERİNER FAKÜLTESİ	-	-	-	-	-	-	41
SAĞLIK YÜKSEKOKULU	396	502	514	544	448	564	475
BESYO	-	-	-	-	-	-	40
SİİRT MYO	744	1498	1575	1748	1715	1798	2048
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO	58	130	170	176	187	339	618
ERUH MYO	-	59	119	96	73	91	145
KURTALAN MYO	-	15	85	138	143	180	393
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	-	-	-	2	7	35	82
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	-	-	-	-	-	21	88
TOPLAM	2729	3894	4517	5147	5012	6023	7404

Yukarıdaki sayılara FARABİ ve Pedagojik Formasyon öğrencileri dahil edilmemiştir.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

ÖĞRENCİ SAYILARI İÇMALI				
Fakülte Adı	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	FARABİ Gelen Öğrenci Sayısı	Toplam
Fen-Edebiyat Fakültesi	169	180	0	349
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	193	154	0	347
İlahiyat Fakültesi	218	230	0	448
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	208	112	0	320
Ziraat Fakültesi	30	16	0	46
Eğitim Fakültesi	971	999	61	2031
Veteriner Fakültesi	28	13	0	41
ÖĞRENCİ SAYISI	1817	1704	61	3582
Fakülte Adı	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	FARABİ Gelen Öğrenci Sayısı	Toplam
Sağlık Yüksekokulu	269	200	6	475
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	27	13	0	40
ÖĞRENCİ SAYISI	296	213	6	515
MYO Adı	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	FARABİ Gelen Öğrenci Sayısı	Toplam
Siirt Meslek Yüksekokulu	1279	769	3	2051
Eruh Meslek Yüksekokulu	47	98	0	145
Kurtalan Meslek Yüksekokulu	256	137	0	393
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	312	306	0	618
ÖĞRENCİ SAYISI	1894	1310	3	3207
Eğitim Fakültesi Adı	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	FARABİ Gelen Öğrenci Sayısı	Toplam
Pedagogik Formasyon	423	621	0	1044
ÖĞRENCİ SAYISI	423	621	0	1044
Enstitü Adı	Erkek Öğrenci Sayısı	Kız Öğrenci Sayısı	FARABİ Gelen Öğrenci Sayısı	Toplam
Fen Bilimler Enstitüsü	61	21	0	82
Sosyal Bilimler Enstitüsü	67	21	0	88
ÖĞRENCİ SAYISI	128	42	0	170
Toplam Öğrenci Sayısı :	4558	3890	70	8518

Üniversitemizde 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında 4 olan Yabancı Uyruklu Öğrenci sayısı 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 106'ya yükselmiştir. Bu öğrencilerin 78'i Suriye 25'i Türkmenistan 1'i Kazakistan 1'i Afganistan 1'i de Pakistan uyrukludur. 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılında kayıt yaptıran Yabancı Uyruklu öğrencilerin 14'ü Eğitim Fakültesi, 12'si Sağlık Hizmetleri M. Yüksekokulu, 31'i İlahiyat Fakültesi, 15'i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 20'si Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 3'ü Ziraat Fakültesi, 2'si Fen-Edebiyat Fakültesi ve 9'u Siirt Meslek Yüksekokulunu tercih etmiştir.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Lojman Durumu

Lojman Adı	1+0(45 m ²)		2+1(102 m ²)		3+1(120m ²)		Zemin Kat		Rektörlük Konutu		TOPLAM
	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	
Merkez Kampusu	12	0	11	0	11	0	2	0	1	0	37
Kezer Kampusu					82	18					100
Kiralama					20	0					20
Toplam	12		11		131		2		1		157

Hizmet Alımı ile çalıştırılan Güvenlik Görevlisi sayısı

S.No	Görevli Olunan Birimler	Güvenlik Görevlisi Sayısı
1	Merkez Kampus ve Sağlık Yüksekokulu	42
2	Kezer Kampusu	14
3	Eruh Meslek Yüksekokulu	5
4	Kurtalan meslek Yüksekokulu	4
TOPLAM		65

Hizmet Alımı Personeli

S.No	Görevli Olunan Birimler		
1	Rektörlük	Makam Hiz.	2
		Şoför	10
		Gen.Hiz. (Büfe)	2
		Kalorifer	2
		Bahçıvan	2
		Genel Temizlik	8
		Teknisyen Yrd.	5
		Büro Hiz.	4
2	Kezer Kampusu Müh.Fak.	Genel Temizlik	13
		Kalorifer	1
3	Meslek Yüksekokulu	Genel Temizlik	9
4	Sağlık Yüksekokulu	Genel Temizlik	4
		Kalorifer	1
5	Eğitim Fakültesi		8
6	El Sanatları		3
7	SKS		2
8	Eruh Meslek Yüksekokulu		2
9	Kurtalan meslek Yüksekokulu		2
TOPLAM			80

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.6- 2014 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler

Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhaleler ve Sözleşme Bedelleri				
	2011	2012	2013	2014
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi	-	1.684.000,00	-	-
Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi	-	2.009.000,00	-	-
Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşi	10.745.000,00	-	-	-
Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	-	1.820.000,00	-	-
Siirt Üniversitesi Ana Kampüs Giriş Düzenleme yapım İşi	-	385.000,00	-	-
Kezer Yerleşkesi Kampüs Yolları Asfalt Kaldırım Hendek ve İstinat Duvarları	-	-	2.640.000,00	-
Merkezi Kafeterya Binası ,Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	-	-	18.540.000,00	-
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi	-	-	10.740.000,00	-
1000 seyirci Kapasiteli Sentetik Yüzeyle Atletizm Pistli Futbol Sahası Yapım İşi	-	-	2.380.000,00	-
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşi	-	-	8.950.000,00	-
Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İşi	-	-	-	1.850.000,00
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	-	-	-	5.800.000,00
Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri	-	-	-	1.180.000,00
37 Daireli Lojman Binasına (3 Blok) Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi ve Kombi Takılması İşleri	-	-	-	89.000,00
Rektörlük Binası ve Siirt MYO Kalorifer Kazanları Doğalgaz Dönüşüm İşleri	-	-	-	205.000,00
TOPLAM	10.745.000,00	5.898.000,00	43.250.000,00	9.124.000,00

Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş, spor sektöründe bir ve teknolojik araştırma sektöründe bir olmak üzere yedi adet proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Birimlerin Makine Teçhizat ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

İhalenin Adı	Ödeme Tutarı TL
350 KVA Jeneratör Alımı	64.428
100 Kullanıcı Simültane Çeviri Sistemi Alımı	75.048
1 Paket EBYS Donanım, 31 Adet İç Ortam Kablosuz Erişim	196.352
9 Kalem Güvenlik Kamerası ve Ekipmanı	35.547
4 Kalem Oluşan Uzaktan Eğitim Merkezi Kurulumu	61.655

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu


Büro Mefruşat Alımı				
Sıra	Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birime Alındığı
1	Büro Mobilyaları Alımı	-	26.724,04 TL	Genel Sekreterlik
2	Büro Mobilyaları Alımı	-	25.135,06 TL	Genel Sekreterlik
3	Büro Mobilyaları Alımı	-	58.901,71 TL	Genel Sekreterlik
4	Büro Mobilyaları Alımı	-	10.734,47 TL	Genel Sekreterlik
5	Büro Mobilya Alımları	-	14.980,22 TL	Genel Sekreterlik

Laboratuvar Cihaz Alımı				
Sıra	Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birime Alındığı
1	Temel Elek.Devreleri Lab.	2	59.500,00 TL	Mühendislik Mimarlık Fak.
2	35 Kalemnden Oluşan Kimya Lab.	35	199.950,00 TL	Fen Edebiyat - MMF
3	4 Kısımdan Oluşan Lab.Kurulumu ve Lab.Cihazı	4	225.066,99 TL	Rektörlük
4	9 Kalemnden Oluşan Lab.Kurulumu	9	78.200,00 TL	Rektörlük
5	Laboratuvar Malzeme alımı	-	140.142,96 TL	Veteriner fakültesi
6	Bilgisayar Lab. Malzeme	-	17.317,09 TL	Mühendislik Mimarlık Fak.
7	LABORATUAR MALZEME ALIM	1	17.317,09 TL	İMİD

Bilgi Teknolojileri Alımı				
Sıra	Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birime Alındığı
1	Dizüstü Bilgisayar Alımı	25	24.197,50 TL	İMİD
2	2 Kısımdan Oluşan Bilgisayar Alımı	2	92.875,00 TL	İMİD
3	Bilgisayar Alımı	-	32.105,46	İMİD
4	Bilgisayar Alımı	-	16.578,71	İMİD
5	Bilgisayar Alımı	-	96.566,38	İMİD
6	Bilgisayar Alımı	-	14.993,49 TL	İMİD
7	SES GÖRÜNTÜ SUNUM CİHAZI	1	10.856,00 TL	İMİD
8	Tarayıcı	-	16.234,601 TL	İMİD
9	BESYO İÇİN ALINAN KAMERA BEDE.	1	8.732,00 TL	BESYO

Bilgisayar Yazılım Alımı				
Sıra	Alınan Malın Adı	Adeti	Tutarı	Hangi Birime Alındığı
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Alımı	1	90.000,00 TL	Genel Sekreterlik
2	Özel Yetenek Sınavı Otomasyon Sistemi	1	44.990,00 TL	BESYO
3	Bilgisayar Yazılım Alımları	1	4.141,80 TL	Genel Sekreterlik
4	Antikor	-	9.940,32 TL	Genel Sekreterlik

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

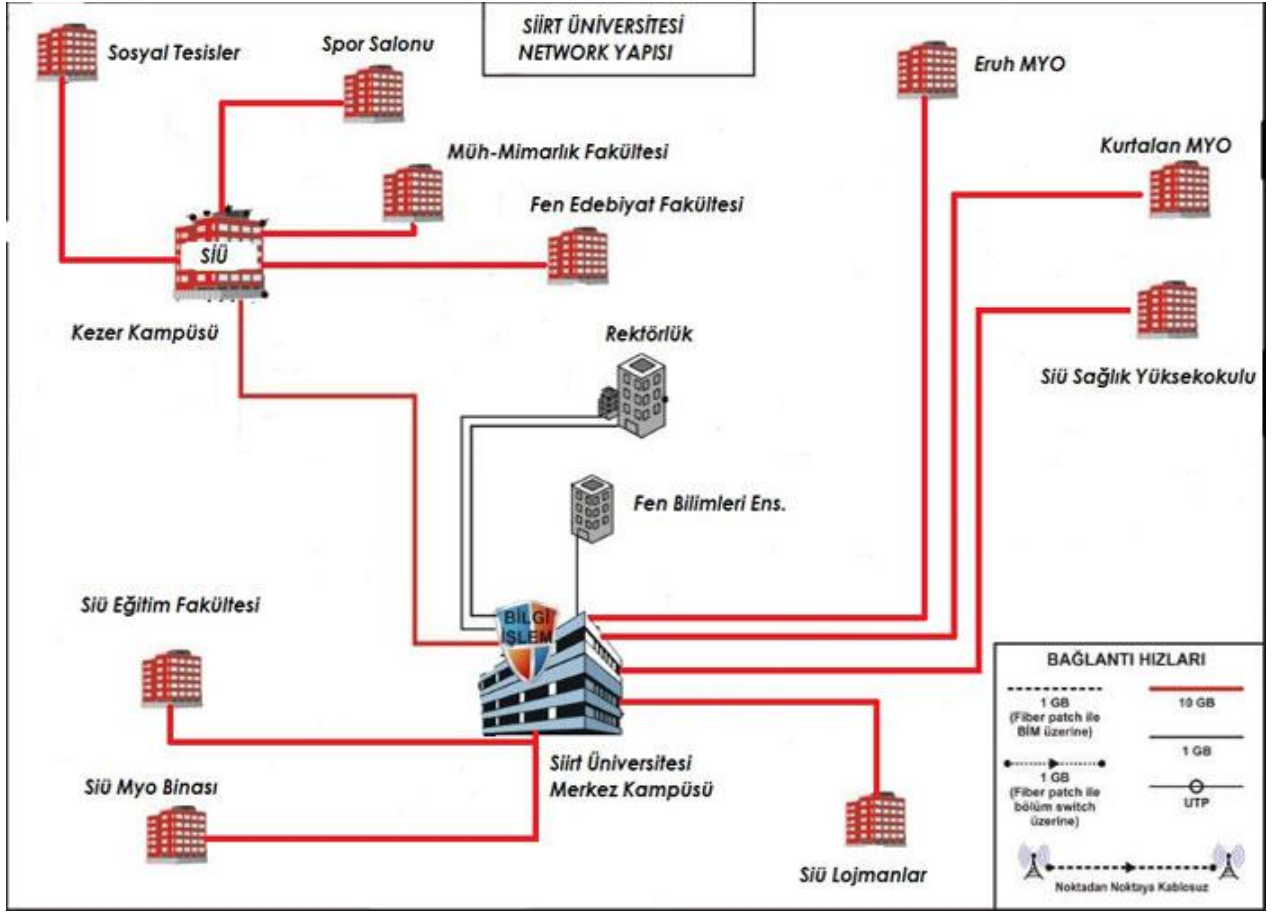

Ziraat Bankasından hibe olarak alınan 2 adet taşıt Üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programında kabul edilmiştir.

TAŞITIN CİNSİ	BÜTÇE	DÖNER SERMAYE Tahsisli
Binek	6	2
Arazi Binek	1	
Otobüs (Sürücü dahil en az 26 kişilik)	3	0
Panelvan	1	0
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	2	0
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1	0
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	1	0
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlık 3501 kg.	1	0
Traktör	4	
TOPLAM	20	2

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon D.Bşk. Basılı Yayın Alımı

Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin gerçekleştirilen ihaleler				
Sıra no	İhale kayıt numarası	İşin adı	İhale Bedeli	KDV Dahil Tutarı
1	2014/22268	3659 kalemden oluşan 9997 adet kitap		257.407.18
Alınan Yayının Adı		Sayısı	Tutarı	Hangi birime alındığı
Basılı Kitap		9997	257.407.18	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

PROJE BAZINDA YAPILAN İŞLER TABLOSU

Çeşitli İşler Etüt Projesi		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Ve İlahiyat Fakültesi Binaları Proje Çizim İş	159.300,00	SIİRT

Kampüs Alt Yapısı		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Ana Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları Yapım İş	14.164,40	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Kampüs Yolları Asfalt Kaldırım,Hendek ve İstinat Duvarı yapım İş	842.435,50	SIİRT

Derslik ve Merkezi Birimler		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı Yapım İş	616.489,11	SIİRT
Merkezi Kafeterya Binası ,Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İş	2.776.444,96	SIİRT
Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İş(2013)	8.444.496,72	SIİRT
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri İnşaatı Yapım İş	7.691.712,05	SIİRT
Sağlık Merkezi İnşaatı Yapım İş	1.509.748,11	SIİRT
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İş	1.066.515,62	SIİRT

Lojman ve Sosyal Tesis		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İş	6.613.858,02	SIİRT

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
1000 Seyirci Kapasiteli Sentetik Yüzeyle atletizm Pistli Futbol Sahası Yapım İş	487.645,06	SIİRT
Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İş-SKS	633.695,75	SIİRT

Büyük Onarım		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Siirt Üniversitesi Ana Giriş Kapısı Tabela Yapım İş	16.520,00	SIİRT
Veteriner Fakültesi ve Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Deforme Olmuş Kapıların Değişmesi İş	13.678,56	SIİRT

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Siirt Kurtalan İsale Hattı Üzerine 2 Adet Yüksek Basınca Dayanıklı Vana Takılması ve 2 Adet Vana Odası Yapım İşİ	16.520,00	SIİRT
SYO Yağmur Oluklarının Yenilenmesi İşİ	15.338,88	SIİRT
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüs Alanında Yer Alan 37 Daireli Lojman Binasına Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi ve Kombi Takılması İşleri	105.020,00	SIİRT
Siirt Üniversitesi Eğitim Kampüs Alanı Rektörlük Binası ve MYO Kalorifer Kazanları Doğalgaz Dönüşümü İşİ	241.899,99	SIİRT
Üniversitemiz Kezer Yerleşkesinde Bulunan Isı Merkezindeki Soğutma Gruplarının Bakım Onarımı	52.866,64	SIİRT
Üniversitemiz Kezer Kampüs ve Merkez Kampüs Çevre Aydınlatma ve Yer altı Kablolarının Bakım Onarımı	3.337,63	SIİRT
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Çarşı İnşaatı Proje Çizim İşİ	17.110,00	SIİRT

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin				Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi				KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : 12 Bütçe Yılı 2014								
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ				EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV								
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1			Mamul Mal Alımları	1.704.720,78	1.704.720,78	0,00	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	0	0	Mamul Mal Alımları	1.704.720,78	0,00					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	0,00	223.775,83					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	0,00	253.089,10					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	1	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	0,00	93.496,36					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	Bilgisayar Alımları	0,00	365.797,63					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	4	Laboratuar Cihazı Alımları	0,00	230.676,86					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0,00	124.785,00					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0,00	365.750,14					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	3	2	Atölye Gereçleri Alımları Alımları	0,00	460,20					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	3	4	Laboratuar Gereçleri Alımları	0,00	46.889,66					
KURUM TOPLAMI :														1.704.720,78	1.704.720,78	0,00	0,00			

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin				Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi										KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : 12 Bütçe Yılı 2014									
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ				EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA				ALINAN ÖDEME EMİRLERİ		HARCAMALAR TOPLAMI		KULLANILABİLİR ÖDENEK		ÖDENEKÜSTÜ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV			I	II	III	IV														
38	73	0	1	9	8	8	0	2	6	1				Mamul Mal Alımları				500.000,00		500.000,00		0,00		0,00			
38	73	0	1	9	8	8	0	2	6	1	0	0		Mamul Mal Alımları				500.000,00		0,00							
38	73	0	1	9	8	8	0	2	6	1	2	90		Diğer Makine Teçhizat Alımları				0,00		500.000,00							
KURUM TOPLAMI :																		500.000,00		500.000,00		0,00		0,00			

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

BÜTÇE GIDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin	Kodu: 56756												KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI												Ait Olduğu Ay : 12	
	Adı : Siirt Üniversitesi																								Bütçe Yılı 2014	
KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SİNİFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ								
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV														
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	215.530,64	215.530,64	0,00	0,00									
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	0	0	Gayri Maddi Hak Alımları	215.530,64	0,00											
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00	172.460,64											
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	3	1	Lisans Alımları	0,00	43.070,00											
													KURUM TOPLAMI :	215.530,64	215.530,64	0,00	0,00									

BÜTÇE GIDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin				Kodu: 56756				KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : 12						
				Adı : Siirt Üniversitesi								Bütçe Yılı 2014						
KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SİNİFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV			I	II	III	IV					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.441.982,80	28.441.982,80	0,00	0,00
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	0	0	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	28.441.982,80	0,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	1	1	1	Proje Giderleri	0,00	159.300,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	1	90	90	Diğer Giderler	0,00	14.164,40		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	4	1	1	Yakacak Alımları	0,00	0,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	1	1	Hizmet Binası	0,00	20.324.579,82		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	2	2	Hizmet Tesisleri	0,00	487.645,06		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	3	3	Lojmanlar	0,00	6.613.858,02		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	7	7	Yol Yapım Giderleri	0,00	842.435,50		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	90	90	Diğerleri	0,00	0,00		
														KURUM TOPLAMI :	28.441.982,80	28.441.982,80	0,00	0,00

BÜTÇE GIDERLERİ VE ÖDEME EMİRLERİ CETVELİ (ÖZEL BÜTÇE)

Muhasebe Biriminin		Kodu: 56756		KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI										Ait Olduğu Ay : 12				
		Adı : Siirt Üniversitesi												Bütçe Yılı 2014				
KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SİNİFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV			I	II	III	IV					
38	73	0	1	9	6	0	0	2	6	5				Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	633.695,75	633.695,75	0,00	0,00
38	73	0	1	9	6	0	0	2	6	5	0	0		Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	633.695,75	0,00		
38	73	0	1	9	6	0	0	2	6	5	7	2		Hizmet Tesisleri	0,00	633.695,75		
														KURUM TOPLAMI :	633.695,75	633.695,75	0,00	0,00

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.7- 2014 Yılı Yatırım Hedefleri

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2014 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığından yıl içinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 4.500.000,00 TL ile birlikte Eğitim ve Spor sektörü projelerine 14.259.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 18.759.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 120.000 TL ödenek düşülmüştür. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmiştir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı(%)
Eğitim	5	127.784.000	20.000.000	17.859.000	120.000	37.739.000	30.607.288	81,10
Spor	1	6.000.000	500.000	900.000		1.400.000	1.121.341	80,10
Araştırma-BAP	1	5.251.000	500.000			500.000	500.000	

BAP kapsamında verilen 500.000,00 TL Araştırma Projeleri ödeneği mevzuatı gereği yıl içinde harcanmak üzere tahakkuka bağlanarak banka özel hesabına aktarılmıştır. Araştırma projesi kapsamındaki bu ödenek geçen yıldan kalan ödenekler ile birlikte cihaz alımında kullanılacaktır.

YILLARA SARI İŞLER PROJE BİLGİLERİ TABLOSU									
İşin Adı	Proje Adı	Proje No	İhale Tarihi	İhale Şekli	Sözleşme Tarihi	Yüklenici Firma	Sözleşme Bedeli	2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Yüzdesi	İnşaat m²
Alt Yapı 1. Etap İnşaatı Yapım işi	Kampüs Alt Yapısı	2009H032260	29.09.2010	AÇIK	05.01.2011	Demir İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. ve Malamira İnş. ve Sondaj Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi	7.485.000,00	%100	
Ana Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları Yapım işi	Kampüs Alt Yapısı	2009H032260	24.08.2012	AÇIK	25.09.2012	Haşemoğlu İnş. Gıda Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	385.000,00	%100	
Kampüs Yolları Asfalt Kaldırım Hendek ve İstinat Duvarları Yapılması işi	Kampüs Alt Yapısı	2009H032260	02.05.2013	AÇIK	03.06.2013	Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayv. San. Tic. A.Ş.	2.640.000,00	%100	
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım işi	Derslik ve Birimler	2009H032270	11.10.2013	AÇIK	29.11.2013	Asmin Mimarlık Mühendislik İnş.Madencilik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	8.950.000,00	%75	11.325 m²

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Fen Edebiyat Fak. İnşaatı yapım işi	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H032270	09.05.2011	AÇIK	11.07.2011	Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.	10.745.000,00	%100	14.223 m ²
Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım işi	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H032270	13.05.2013	AÇIK	06.06.2013	Bablular İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayvancılık Tic. San. A.Ş. Ortak Girişimi	18.540.000,00	%48	12.250m ² 10.400 m ²
Sosyal Tesisi İkmal İnşaatı Yapım işi	Lojman ve Sosyal Tesis	2009H032280	07.05.2012	AÇIK	27.06.2012	Özbar Elektrik Nak. İnş. Tem. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.	2.009.000,00	%100	3.565 m ²
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu İnşaatı Yapım işi	Lojman ve Sosyal Tesis	2009H032280	28.03.2013	AÇIK	08.05.2013	Sağır İnş. Gıda Teks. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. & Keskinler İnş. Gıda İçecek Tar. Hayv. Tic. San. A.Ş. Ortak Girişimi	10.740.000,00	%96	60.000 m ²
Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı Yapım işi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H050220	10.05.2012	AÇIK	23.08.2012	Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayv. San. Tic. A.Ş.	1.820.000,00	%100	3.320 m ²
1000 Seyirci Kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyli Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı Yapım işi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H050220	07.06.2013	AÇIK	05.07.2013	Cihan – Er Müh. Nak. İnş. Taah. Harf. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	2.380.000,00	%100	22.000 m ²

2014 Yılı Yapım İşleri Proje Bilgileri Tablosu

İşin Adı	İhale Tarihi	İhale Şekli	Sözleşme Tarihi	Yüklenici Firma	Yaklaşık Maliyet	Sözleşme Bedeli TL
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenlemeleri Yapım işi	03.07.2014	AÇIK	13.08.2014	Haşemoğlu İnşaat Gıda Nakliyat Turizm Tic.San. ve Lmtđ. Şti.	7.029.463,41	5.800.000,00
Sağlık Merkezi İnşaat Yapılması işi	16.05.2014	AÇIK	18.06.2014	Asmin Mimarlık Mühendislik İnş.Madencilik Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.	2.016.701,21	1.850.000,00
Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım işi	24.04.2014	AÇIK	18.06.2014	İsmet YARGICI	1.428.141,67	1.180.000,00

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.
- Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir.
- Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması.
- Bölgenin olumsuz şartları nedeni ile ihalelere katılmak isteyen yatırımcı sayısının yetersiz olması.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

III- ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

3.1- 2014H030470 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim
Proje No	2014H030470
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Bedeli	100.000,00 TL
Eklenen Ödenek	60.000,00 TL
Yılı Ödeneği	160.000,00 TL
Yılı Harcaması	159.300,00 TL
Kalan Ödenek	700,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%99,56
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%99,56
AÇIKLAMALAR: - Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Ve İlahiyat Fakültesi Binaları Proje Çizim İşİ yapılmıştır. - 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.	



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.2- 2014H030480 Muhtelif İşler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2014H030480	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Tek.D.Bşk., İMİD D. Bşk., SKS D. Bşk. ile Kütüphane ve Dök. D. Bşk.	
Proje Bedeli	3.750.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	609.000,00 TL	
Düşülen Ödenek	120.000 TL	
Yılı Ödeneği	4.239.000,00 TL	
Harcama	2.652.950,30 TL	
Kalan Ödenek	1.586.049,70	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%62,58	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%62,58	
İşin Adı	Proje Adedi	2014 Harcama Tutarı
Büyük Onarım	1	482.291,70 TL
Makine, Teçhizat Alımı	1	1.704.720,78 TL
Kütüphane Yayın Alımı	1	250.407,18 TL
Bilgi Teknolojileri	1	215.530,64 TL
AÇIKLAMALAR:		
- Büyük bakım onarım işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. - İMİD Başkanlığı tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere makine, teçhizat, eğitim donanımı ile büro mobilyaları alınmıştır. - Çeşitli birimlerin yazılım ihtiyaçları İMİD Başkanlığı bütçesinden satın alınmıştır. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.3- 2009H032260 Kampüs Altyapısı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032260	
Projenin Adı	Kampüs Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	23.00.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	15.544.823,69 TL	
2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	1.500.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	900.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	2.400.000,00 TL	
Yılı Harcama	856.599,90 TL	
Kalan Ödenek	1.543.400,10 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%35,69	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%67,59	
İşin Adı	Adedi	2014 Harcama Tutarı
Ana Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	1	14.164,40
Kezer Yerleşkesi Kampüs Yolları Asfalt Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarı yapım İşi	1	842.435,50
Açıklama: 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032270	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	80.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	36.567.245,09 TL	
2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	11.150.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	13.090.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	24.240.000,00 TL	
Yılı Harcaması	20.324.579,82 TL	
Kalan Ödenek	3.915.421,00 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%83,85	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%71,11	
İşin Adı	Adedi	2014 Harcama Tutarı
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaatı Yapım İşİ	1	616.489,11
Merkezi Kafeterya Binası,Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşİ	1	9.440.114,93
Eğitim fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşİ	1	7.691.712,05
Sağlık Merkezi İnşaatı Yapım İşİ	1	1.509.748,11
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşİ	1	1.066.515,62
AÇIKLAMALAR:		
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 8.590.000,00 TL likit karşılığı ve 4.500.000,00 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneği olmak üzere toplam 13.090.000,00 TL ödenek eklenmiştir.		

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032280	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	20.934.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	11.689.299,24 TL	
2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	3.500.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	3.200.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	6.700.000,00 TL	
Yılı Harcaması	6.613.858,02 TL	
Kalan Ödenek	86.141,98 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%98,71	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%87,43	
İşin Adı	Adedi	2014 Harcama Tutarı
Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşİ	1	6.613.858,02
AÇIKLAMALAR:		
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010H050220	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	6.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	4.551.003,48 TL	
2014 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	500.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	900.00,00 TL	
Yılı Ödeneği	1.400.000,00 TL	
Yılı Harcaması	1.121.340,81 TL	
Kalan Ödenek	278.659,19 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%80,10	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%94,54	
İşin Adı	Adedi	2014 Harcama Tutarı
1000 seyirci Kapasiteli Sentetik Yüzeyli Atletizm Pistli Futbol Sahası Yapım İşi	1	487.645,06
Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi	1	633.695,75
AÇIKLAMALAR:		
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.7- 2010K121370 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sektörün Adı	DKH-Teknolojik Araştırma	
Proje No	2010K121370	
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Rektörlük Özel Kalem	
Proje Bedeli	5.251.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	1.495.605,63 TL	
2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	500.000,00 TL	
Önceki Yıllardan Banka Özel Hesabında Kalan Ödenek	2.660.394,37 TL	
Toplam Ödenek	3.160.394,37 TL	
Yılı Harcaması	2.577.762,96 TL	
Önceki Yıllar Bütçe Dışı Harcama	512.915,60 TL	
Banka Özel Hesabında Kalan Ödenek	582.631,41 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%81,56	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%87,34	
İşin Adı	Adedi	Cihaz Alım ve Tezgah Yapım Giderleri
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İleri Teknoloji Cihaz Alımı		1.643.175,00 TL
Yurtdışı Cihaz Alımı		420.438,60 TL
Yurtdışı Alım Komisyon, Gümrük ve Harç Giderleri		12.649,36 TL
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Tezgah Kurulumu		501.500,00 TL
Açıklamalar: 2.000 m² Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı ihalesi 16/12/2011 tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılında geçici kabulü yapılan işin sözleşme bedeli olan 1.684.000,00 TL'nin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 1.500.000,00 TL'yi aşan kısmı (+KDV) bütçe dışı kaynaklardan ödenerek projenin bina inşaatı %100 tamamlanmıştır. Bu projede önceki yıldan kalan ödeneklerle birlikte yılı bütçe ödeneği de laboratuvar cihaz alımı kapsamında değerlendirilmek üzere mevzuatı gereği tahakkuka bağlanarak banka özel hesabına aktarılmıştır.		



Üniversitemiz bünyesinde uzun zamandır inşa ve altyapı çalışmaları devam eden Merkezi Araştırma Laboratuvarı, nihayet kullanım aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Laboratuvarımız iki önemli hedefi gerçekleştirmek üzere faaliyetlerine başlayacaktır. Bunlardan bir tanesi bilim insanlarının ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri yapmak bir diğeri ise bölge laboratuvarı özelliği taşımak üzere özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek analiz taleplerini karşılamaktır. Modern ve son teknoloji ürünler ile donatılmış 2.000 m2 kullanım alanından oluşan 2 katlı Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde toprak, su, gıda ve maden alanlarıyla ilgili tüm analizleri gerçekleştirilebilecek, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm istekleri karşılanabilecek olup, bilimsel araştırmalarda hem Siirt Üniversitesi'nin hem de diğer üniversitelerin araştırmalarına yardımcı ve öncü olunabilecektir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile yapılacak olan akreditasyon çalışmalarıyla da laboratuardan alınacak sonuçlar uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.




ÜNİVERSİTEMİZDE TAMAMLANAN PROJELER

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER


Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yapım İşi:

Fakültemiz 3 blok ve 1 adet ısı merkezinden oluşmakta olup 21.000 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 22 adet derslik, 38 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu ve 46 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır. Fakültemiz 16.373.646,56 TL + KDV ile tamamlanmıştır.

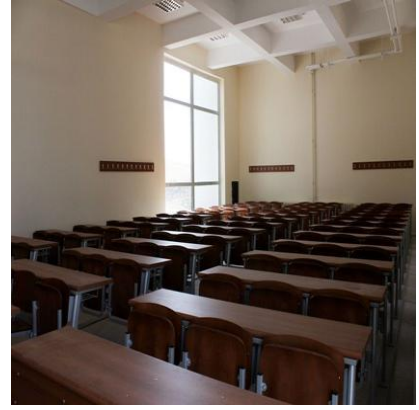

Fen Edebiyat Fakültesi Yapım İşi:

Fakültemiz 2 bloktan oluşmakta olup 14.250 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 24 adet derslik, 22 adet laboratuvar, 2 adet konferans salonu ve 41 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır. Fakültemiz 12.262.625,32,00 TL + KDV ile tamamlanmıştır.

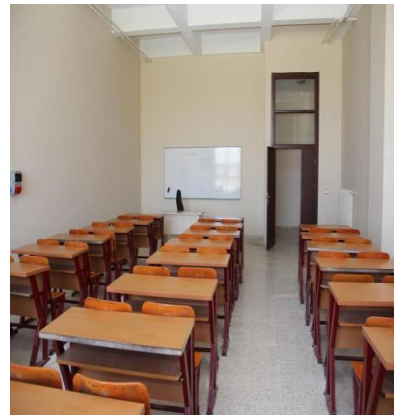

KAMPÜS ALT YAPISI:

Yeni Kampüs Alanı Çevre İhata Duvarı Ve Koruma Çiti Yapılması:

Satın alınan şahıs arazileri ile üniversitemize tahsis edilen arazilerin bütünlüğünü sağlamak için kampüs sınırına 10.500 mt'lik betonarme duvar ile tel kafes yapılmıştır. Bu imalatın 1800 metrelik kısmı betonarme duvar, geri kalan kısmı ise betonarme direkli tel kafes şeklindedir. Projemiz 869.796,07 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Kampüs Altyapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İşi:

Bu proje kapsamında tüm yolların kaldırım ve asfalt imalatları haricinde, atık su, yağmur suyu, elektrik imalatları ve 6 adet trafo merkezi yapılacaktır. Yüzde 10'luk keşif artışı kapsamında 4500 kişilik arıtma tesisi yapılmıştır. Proje 9.408.897,12 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Kezer Yerleşkesi Kampüs yolları Asfalt, Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarları Yapım İşi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizce ana güzergâh olarak belirlenen yolların asfalt, kaldırım, hendek ve istinat duvarları çalışmaları yapılmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Proje 2.601.315,86 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

LOJMAN VE SOSYAL TESİSLER

Lojman İnşaatı Yapım İşi:

Şehir Merkezi Lojmanımız 11 adet 3+1, 11 adet 2+1 ve 12 adet stüdyo daireden oluşmaktadır. Lojmanın üst katında 1 adet 2+1 ile 1 adet 3+1 daireden rektörlük konutu ve bu konutun üstünde teras kat oluşturulmuştur. Ayrıca bodrum katında 2 adet 2+1 daire oluşturulmuştur. Projemiz 1.917.880,14 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi:

Bu proje kapsamında 100 lojman, Rektörlük Konutu ve Isı merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır.



Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi:

Bu proje 2010 yılında 2.088.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 2.009.000,00 TL'dir. Bu proje 39 normal oda 2 suit oda olmak üzere toplam 41 oda, 1 yemekhane ve 1 kafeteryadan müteşekkildir.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu



AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ:



Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Soyunma Odaları ve Portatif Tribün Yapılması Yapım İşi:

Futbol sahası FIFA standartlarına uygun olup 1000 seyirci kapasitelidir ve 4 adet soyunma odasına sahiptir. Projemiz 2.401.136,66 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi:

Bu proje 2010 yılında 2.138.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 1.820.000,00 TL'dir. Salonumuz 3320 m² kapalı alana sahiptir.

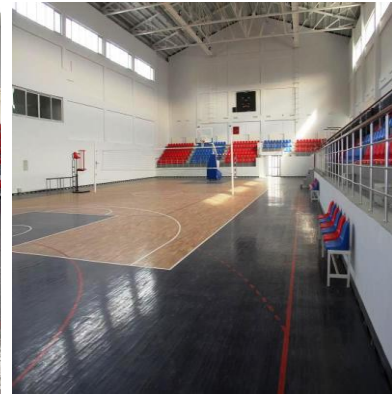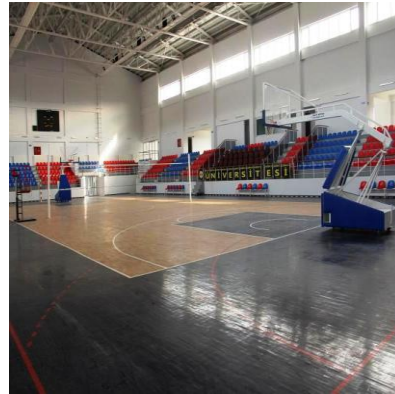

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Laboratuvar binamız 2.000 m² kapalı alana sahip olup, bünyesinde 14 adet laboratuvar barındırmaktadır. Projemiz 1.702.136,64 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Şehir Kampüsü Giriş Kapısı ve Güvenlik Kulübesi:

Kampüs girişi dar olduğundan, mevcut betonarme giriş kapısında yer alan mermerlerin de dökülmeye karşı tehlike arz etmesi ve anayol trafik akışını engellediğinden, beton yapı yıkılmış daha geniş araç yolu ve yerine çelik konstrüksiyon üzeri alüminyum kompoze kaplanarak, yeni güvenlik kulübesi yapılmıştır.



Ana Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları:

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine ana giriş kapısı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ana kampüs girişi 388.120,59 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Siirt M.Y.O İdare Ek Bina Yapım İşi:

Üniversitemizin kurulma aşamasında fiziki alanı rahatlatmak adına 9 odalı ve 189 m² kapalı alana sahip tek katlı öğretim elemanı ofisi yapılmıştır. Söz konusu iş 81.106,15 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Güvenlik Kulübeleri ve Şoför Odası Yapım İşleri:

Bu proje ile Üniversitemiz Rektörlük binası yanına 3 odalı şoför odası, Sağlık Yüksekokulu girişine 1, 37 Daireli lojman girişine 1 olmak üzere 2 adet güvenlik kulübesi yapılmıştır. Projemiz 81.999,95 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Şehir Kampüs Alanı Rektörlük Binası ve Siirt MYO Kalorifer Kazanları Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi:

Üniversitemiz Şehir Kampüs Alanında bulunan binaların doğalgaz ile ısınması için Rektörlük Binası ve Siirt MYO'nda bulunan kalorifer kazanlarının doğalgaz dönüşümü yapılmıştır.

Şehir Kampüs Alanında Yer Alan 37 Daireli Lojman Binasına (3 Blok) Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi ve Kombi Takılması İşleri:

Şehir Kampüs alanında yer alan 37 daireli lojman binasına doğalgaz tesisatı çekilmiş ve dairelere kombi takılmıştır.

Siirt MYO WC ve Lavaboları İle Bodrum Katında Bulunan 3 Adet Laboratuvarın Tanzimi ve Bakım Onarımı:

Siirt Meslek Yüksekokulu bodrum katında yer alan ve atıl durumda bulunan mekânlar yeniden değerlendirilerek Meslek Yüksekokulunun laboratuvar ihtiyacı karşılanmıştır. Ayrıca 1. ve 2. Katta yer alan erkek ve bayan wc ve lavaboları da komple bir tadilat ile yıkılarak yenilenmiştir.

Sağlık Yüksekokulu Bakım Onarım ve Tadilat İnşaatı Yapım İşi:

Eski bina yıkılarak mevcut binada yapılan tadilatlar ile yeni öğretim elemanı odaları, derslikler, kantin ve lavabolar oluşturulmuştur. Bina kapı ve pencereleri ile çatı örtüleri yenilenmiştir. Bahçe ve çevre tanzimi yapılarak genel bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mevcut olup kullanılmayan basketbol sahasına saha betonu dökülmüş, etrafı tel örgü ile kapatılmıştır.

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Şehir Merkezi Eski Eğitim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Eruh Meslek Yüksekokulu Bakım Onarım İşleri:

Üniversitemiz Eğitim Kampüs alanında yer alan kamelya onarılmış, Sağlık Yüksekokulunda bulunan çevre ihata duvarı yıkılarak yeniden yapılmış ve Eruh Meslek Yüksekokulunda bulunan mutfak ve jeneratör odası onarılmıştır. Bakım onarım çalışmamız 64.077,90 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Eğitim Kampüsü Binaları ve Kurtalan Meslek Yüksekokulu Binası Bakım Onarım İşleri:

Üniversitemiz Şehir Kampüs alanında yer alan Rektörlük binasının dış cephesi boyanmış, Eski Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu binalarının çatıları onarılmış ve Kurtalan Meslek Yüksekokulu binasının pencereleri PVC yapılmıştır. Söz konusu işler 239.000,00 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Muhtelif İşlet Projesi Kapsamında Yürütülen Bazı Faaliyetlere Ait Resimler Aşağıda Verilmiştir.






YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşİ:

Bu proje kapsamında Üniversitemize 10.400 m² merkezi kafeterya binası ve iki bloktan oluşan 12.250 m² rektörlük binası ve çevre düzenleme çalışmaları yapım işleri yapılacaktır.

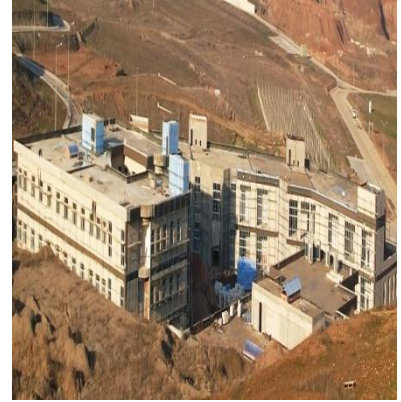

Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşİ:

Fakültemiz 2 bloktan oluşmakta olup 10.145m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 27 adet derslik, 1 adet konferans salonu ve 40 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır.



Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İş:

Bu proje kapsamında Üniversitemiz bünyesine 880 m² kapalı alana sahip sağlık merkezi ve çevre düzenleme işleri yapılacaktır.



Siiirt Üniversitesi Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İş:

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine kütüphane binası yapılacak olup, söz konusu bina 5.560 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 4 adet okuma salonu, 12 adet grup çalışma odası ve 18 adet bireysel çalışma odası bulunmaktadır.



Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi:

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine 1 adet kapalı halı saha, 2 adet açık basketbol–voleybol sahası 2 adet açık tenis kortu ve soyunma odaları yapılacaktır.



IV- ÖNERİLER

- Yeni kurulan bir Üniversite olarak öngörülen hedeflerimize ulaşabilmek için bütçe ödeneklerimizin artırılması gerektiği düşünülmektedir.
- Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programında kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması uygun olacaktır.
- Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
- Maliye Bakanlığınca onaylanan İcmal Harcama Programı ile Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine iki dilim halinde serbest bırakılması verimi artıracaktır.
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin tümünü karşılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

V- EKLER

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SEKTÖR EĞİTİM

2014 Nakdi

NO (1)	(2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	BÜTÇE TÜRÜ (5)	BİTİŞ YILI (6)	YERİ (7)	PROJE TUTARI		Önceki Yıllar KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2014 YILI ÖDENEĞİ			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
1		2014H030470	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel	2014	Siirt		100.000,00				100.000,00	+	60.000,00			159.300,00
2		2014H030480	Muhtelif İşler (GAP)	Özel	2014	Siirt		3.750.000,00				3.750.000,00	+	489.000,00			2.652.950,30
3		2009H032260	Kampüs Alt Yapısı (GAP)	Özel	2016	Siirt		23.000.000,00	15.544.823,69			1.500.000,00	+	900.000,00			856.599,90
4		2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)	Özel	2016	Siirt		80.000.000,00	36.567.245,09			11.150.000,00	+	13.090.000,00			20.324.579,82
5		2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Özel	2015	Siirt		20.934.000,00	11.689.299,24			3.500.000,00	+	3.200.000,00			6.613.858,02
						TOPLAM		127.784.000,00	63.801.368,02			20.000.000,00		17.739.000,00			30.607.288,04
SEKTÖR ADI :		SPOR															
1		2010H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2014	Siirt		6.000.000,00	4.551.003,48			500.000,00	+	900.000,00			1.121.340,81
						TOPLAM		6.000.000,00	4.551.003,48			500.000,00		900.000,00			1.121.340,81
SEKTÖR ADI :		DKH															
1		2010K121370	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel	2014	Siirt		5.251.000,00	1.495.605,63			500.000,00					500.000,00
						TOPLAM		5.251.000,00	1.495.605,63			500.000,00					500.000,00
			GENEL TOPLAM					139.035.000	69.847.977,13			21.000.000,00	+	18.639.000,00			32.228.628,85

Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SIİRT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: ÖZEL

2014 Yılı Fiyatları

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2013 Sonu Kümülatif Harcama		2014 Yılı Program Ödeneği			2014 Yılı Revize Ödenek			2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
Enerji															
Konut															
Eğitim	5		127.784.000,00			63.801.368,02			20.000.000			37.739.000			30.307.288,04
Spor	1		6.000.000,00			4.551.003,48			500.000			1.400.000			1.121.340,81
Diğer Kamu Hizmetleri - Teknolojik Araştırma	1		5.251.000,00			1.495.605,63			500.000			500.000			500.000,00
TOPLAM	7		139.035.000,00			69.847.977,13			21.000.000			39.639.000			32.228.628,85

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Siirt ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VAZİYET PLANI



www.siirt.edu.tr
