

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

2015 YILI


**YATIRIM PROGRAMI
İZLEME**

VE

**DEĞERLENDİRME
RAPORU**

Mart 2016

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



İÇİNDEKİLER

I - ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	4
II – GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1- Misyon	5
2.2- Vizyon	5
2.3- Finansman Kaynakları	5
2.4- Temel Amaç ve Hedefler	7
2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi	8
2.6- Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler	19
2.7- Yılı Yatırım Hedefleri	24
2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu	24
2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	25
III- YILI YATIRIM PROGRAMI	25
IV- ÖNERİLER	37
V - EKLER	37
Siirt Üniversitesi Yılı Yatırım Projeleri Listesi	38
Siirt Üniversitesi Yılı Kamu Yatırımları Özeti	39
Siirt Üniversitesi Yerleşkesi Vaziyet Planı	40

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

I- ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Yatırımların planlandığı şekilde tamamlanması, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde idarelere, çeşitli raporların hazırlanması esası getirilmiştir. Bu sayede kamu harcamalarının yerinde ve gerektiği ölçüde yapılması, daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanmış olacaktır.



Aynı Kanun'un 25'inci maddesinde ise, yatırım projesi uygulayan kamu idarelerinin yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin raporların hazırlanması, ilgili kuruluşlara gönderilmesi ve yatırım harcamalarının verimliliğini kontrol etmeleri istenmiştir. Üniversitemizin yılı yatırım bütçe ödenekleri ve yatırım programı çerçevesinde öngörülen ihaleler düzenlenmiş olup, ihaleleri tamamlanarak yükleniciye teslim edilen işler, imalatın her aşamasında kontrol ve denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz hedefleri göz önünde bulundurularak sürdürülen altyapı faaliyetlerine devam edilerek, büyük bakım onarım ihaleleri kapsamında ayrıntısı raporun ilgili bölümünde belirtilen çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizat ile donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz; bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışarak, bilgiyi üreten, paylaşan ve uygulamaya dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Birimlerin makine, teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 ve 60'ıncı maddeleriyle Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesi uyarınca Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Murat ERMAN
Rektör

II – GENEL DEĞERLENDİRME

2.1- Misyon

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

2.2- Vizyon

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış, yerel ve ulusal sorunları çözmeye yönelik sanayi ve toplumun işbirliği ile çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş ve sürekli gelişen bir üniversite olmak.

2.3- Finansman Kaynakları ve Yasal Dayanaklar

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup özel bütçeli bir kurumdur.

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte,

- ✚ 2547 sayılı yasanın 55'inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını; her yıl bütçeye konulacak ödenekleri, 46'ıncı maddesi cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirleri,
- ✚ Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7'nci maddesi, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- ✚ 2547 sayılı yasanın 58'inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılâtın %10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri,
- ✚ 2547 sayılı yasanın Ek 25'inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirleri,
- ✚ Ek 26'ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri,
- ✚ Ek 27'nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri,
- ✚ 2547 sayılı yasanın 43'üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri

yükseköğretim kurumlarının bütçesini oluşturmaktadır.

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Gelirler

A) Özel Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler
 - 1) Kira Gelirleri
 - 2) SKS (sosyal tesis, kantin, kafeterya işletme) Gelirleri
 - 3) Öğrenci Harç Gelirleri
 - 4) Devletçe Karşılanan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

B)Döner Sermaye Gelirleri

C)Bütçe Dışı Kaynak ve Proje Destekleri

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Hibe
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlar

Üniversitemizin 2015 yılı **yatırım bütçesi** başlangıç ödenekleri toplam 23.000.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde 14.114.000,00 TL eklenerek toplam ödenek 37.114.000,00 TL olmuş ve bu ödeneğin 33.451.741,94 TL'si harcanmıştır.

EKO. KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	Harc Oranı %
06.1	Mamul Mal Alımları	2.198.000,00	3.549.000,00		5.747.000,00	3.644.082,71	63,41
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	200.000,00	45.000,00		245.000,00	135.852,90	55,45
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.102.000,00	10.370.000,00		30.472.000,00	29.075.605,44	95,42
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000,00	150.000,00		650.000,00	596.200,89	91,72
GENEL TOPLAM		23.000.000,00	14.114.000,00	0	37.114.000,00	33.451.741,94	90,13

2015 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödeneklerin tamamı amacına uygun olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığında yıl içinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 5.000.000,00 TL ile birlikte Eğitim ve Spor sektörü projelerine 9.114.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 14.114.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz yatırım programına alınan projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmiştir.

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.4-Temel Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Amaç-1 EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
Amaç-2 EĞİTİM ALT YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1. Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi
	HEDEF 2. 2. Üniversitenin Bilişim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi
	HEDEF 2.3. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi ve yerleşkenin oluşturulması
	HEDEF 2.4. Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi
	HEDEF 2.5. Kamu kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi
	HEDEF 2.6. Üniversite ile sanayi işbirliğini ileriye taşıyarak bölge sanayisinin geliştirilmesi ve kalifiye eleman temininin sağlanması
Amaç-3 İNSAN KAYNAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve İdari Personel Yetiştirilmesi
Amaç-4 BİLİMSEL FAALİYETLERİN NİTELİK VE NİCELİĞİNİN ARTIRILMASI	HEDEF 4. 1. Üniversitenin Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Artırılması
	HEDEF 4.2. Yayınların artırılması
	HEDEF 4.3. Araştırma Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması.
Amaç-5 FİNANSAL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5. 1. Döner Sermaye İşletmesinin faaliyete geçirilmesi ve gelirlerinin arttırılması
	HEDEF 5. 2.Üniversitemiz paydaşlarından sağlanan desteklerin artırılması

2.5- Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana kaliteli eğitim-öğretim verme çabasını devam ettirmektedir. 2015 yılı itibarıyla Üniversitemize bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere yedi fakülte, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere dört enstitü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 adet yüksekokul bulunmaktadır.



Üniversitemizin şehir merkezi kampus alanı 25.512,22 m²'dir. Burada Veteriner Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile 37 dairesel lojmanlar bulunmaktadır. Ayrı bir yerleşkede hizmet veren Sağlık Yüksekokulunun alanı da 9.040,00 m²'dir. Kezer kampus alanında ise Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rektörlük A ve B Blok, Merkezi Kafeterya, 1000 seyirci kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahası, Konukevi, 100 Dairesel Lojman, Rektörlük Konutu, Sağlık Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Halı Saha, Tenis Kortu ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı binaları tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Merkezi Kütüphane Binası, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve 2'nci etap altyapı çalışmalarına ait imalat ve inşaatları devam etmektedir.

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Üniversitemize ait Yerleşkelerin Taşınmazlar İtibariyle Dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)		Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine/Diğer	
Merkez Kampus Alanı		25.512,22	25.512,22
Kezer Kampus Alanı	657.919,11	1.568.221,72	2.226.140,83
Eruh Meslek Yüksekokulu		45.903,53	45.903,53
Kurtalan Meslek Yüksekokulu		4.816,00	4.816,00
Sağlık Yüksekokulu		9.040,00	9.040,00
Toplam	657.919,11	1.653.493,47	2.311.412,58

Üniversitemizin Personel Durumu

Akademik Personel			
Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör	11	7	17
Doçent	25	22	45
Yrd. Doçent	117	10	127
Öğretim Görevlisi	92	60	152
Okutman	15	17	32
Uzman	8	8	16
Çevirici	0	1	1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı	0	1	1
Araştırma Görevlisi	143	71	214
TOPLAM	411	195	606

Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
Unvan	Geldiği Ülke	Çalıştığı Bölüm	Kişi Sayısı
Profesör	Suriye	İlahiyat Fak.	1
Doçent	Azerbaycan	Fen. Ede. Fak.	1
Yrd. Doç.	Mısır	İlahiyat Fak.	1
Yrd. Doç.	İran	Ziraat Fak.	1
Öğretim Gör.	Suriye	İlahiyat Fak.	5
Öğretim Gör.	Suriye	Mühendislik Fak.	1
TOPLAM			10

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel			
Unvan	Çalıştığı Bölüm	Geldiği Üniversite	Kişi Sayısı
Profesör	Ziraat Fak.	Sütçü İmam Üniv.	1
Profesör	İlahiyat Fak.	Yüzüncü Yıl Üniv.	1
Profesör	Eğitim Fak.	Gazi Üniv.	2
Profesör	Veteriner Fak.	Harran Üniv.	1
Profesör	Veteriner Fak.	Kırıkkale Üniv.	1
Profesör	Fen Ede. Fak.	Fırat Üniv.	1
Doçent	Fen Ede. Fak.	Balıkesir Üniv.	1
Yrd. Doç.	İİBF	Yüzüncü Yıl Üniv.	1
Yrd. Doç.	Mühendislik Fak.	Bitlis Eren Üniv.	1
Toplam			10

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	202	159	361
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	8	13	21
Teknik Hizmetleri Sınıfı	33	32	65
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1	1	2
Din Hizmetleri Sınıfı	0	1	1
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	38	14	52
TOPLAM	282	220	502

Daire Başkanlıkları	Birimler	Koordinatörlük ve Programlar
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	BAP	Erasmus+
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	EBYS Koordinatörlüğü
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Farabi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Hukuk Müşavirliği	Mevlana Değişim Programı
Personel Daire Başkanlığı	Etik Kurulu Birimi	Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Ösym Bürosu	Uluslararası İlişkiler Ofisi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Proje Yönetim Ofisi	Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Koordinatörlüğü	
	Sivil Savunma Uzmanlığı	
	Yeşil Alan Müdürlüğü	

Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar				
	2012	2013	2014	2015
Taşınmaz Alanların m ² si	2.311.412,58	2.311.412,58	2.311.412,58	2.311.412,58
Öğrenci Sayısı	5.145	6.023	8.117	9.300
Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların m ² 'si (Taşınmaz Alanların m ² 'si/Öğrenci Sayısı)	449,25	383,76	284,76	248,54

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m ²)								
Birim Adı	Eğitim Öğretim ve Araştırma	Sağlık	Barınma (Lojman)	Beslenme	Kültür	Spor	İdari ve Diğer	Toplam (m ²)
Merkez Yerleşke	1.992	97	4.650	1.575	1.309	-	6.844	16.017
Sağlık MYO	746	24	-	108	-	422	1.780	3.080
Eruh MYO	409	-	1.023	383	-	-	1.083	2.898
Kurtalan MYO	380	-	-	-	-	-	538	918
Kezer Yerleşkesi	32.218	1.000	22.285	12.250	6.500	3.368	26.047	103.668
TOPLAM	35.745	1.121	27.958	14.316	7.809	3.790	36.292	126.581

Fakülte	Yüksekokul	Meslek Yüksek Okulu
Eğitim Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Eruh Meslek Yüksekokulu
Fen - Edebiyat Fakültesi	Siirt Sağlık Yüksekokulu	Kurtalan Meslek Yüksekokulu
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi	Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi	Yabancı Diller Yüksekokulu	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi		Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi		
Ziraat Fakültesi		
Enstitü		
Fen Bilimleri Enstitüsü	Araştırma Merkezi	
Sağlık Bilimleri Enstitüsü		
Sosyal Bilimler Enstitüsü		
Yaşayan Diller Enstitüsü		

Lojmanlar

Lojman Adı	1+0(45 m ²)		2+1(102 m ²)		3+1(120m ²)		Zemin Kat		Rektörlük Konutu		TOPLAM
	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	Dolu	Boş	
Merkez Kampusu	10	2	11	0	11	0	2	0	1	0	37
Kezer Kampusu					98	2					100
Kiralama					20	0					20
Toplam	12		11		131		2		1		157

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu



Kullanılan Yazılımlar

Yazılım-Program Adı
Öğrenci İşleri Otomasyonu
Personel Bilgi Otomasyonu
Windows XP İşletim Sistemi, Office
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Antikor Web Filtreleme
Antikor Güvenlik
Logsing Ağ Yönetim
Kaspersky Antivirüs
AMP İhale Takip Programı
Netgear Sanallaştırma Yazılımı
BAP Ödeme Otomasyonu
Yazılım Sunucu Yönetimi
Yordam Kütüphane Otomasyonu

Bölüme Göre Kütüphane Kaynaklarımız					
Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	TOPLAM
Tıp	333				333
Fen	100				100
Sosyal	200				200
Diğerleri	22.076				22.076
TOPLAM	22.709				22.709

Yönetim



Prof.Dr. MURAT ERMAN
Rektör



Prof.Dr. ENDER SİNAN
POYRAZOĞLU
Rektör Yardımcısı



Prof.Dr. GALİP BAKIR
Rektör Yardımcısı



Prof.Dr. YÜKSEL BİRİNCİ
Rektör Yardımcısı

SIİRT ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizde Faaliyet Gösteren Araştırma Merkezleri

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Özel Güvenlik Elemanı Sayısı

S.No	Görevli Olunan Birimler	Güvenlik Görevlisi Sayısı
1	Merkez Kampus ve Sağlık Yüksekokulu	40
2	Kezer Kampusu	16
3	Eruh Meslek Yüksekokulu	5
4	Kurtalan meslek Yüksekokulu	4
TOPLAM		65

Özel Temizlik Elemanı Sayısı ve Birimlere Göre Dağılımı

S.No	Görevli Olunan Birimler			Top.Sayı
1	Rektörlük	Şef	1	38
		Makam Hizmetleri	3	
		Şoför	10	
		Genel Hizmetler (Büfe)	2	
		Kalorifer	5	
		Bahçıvan	1	
		Genel Temizlik	4	
		Teknisyen Yrd.	5	
		Büro Hizmetleri	7	
2	Fen- Edebiyat Fakültesi	Genel Temizlik		2
3	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Genel Temizlik		2
4	BESYO	Genel Temizlik		1
5	Sağlık Yüksekokulu	Genel Temizlik		4
6	İlahiyat Fakültesi	Genel Temizlik		2
7	Eğitim Fakültesi	Genel Temizlik		4
8	Ziraat Fakültesi	Genel Temizlik		1
9	SKS Daire Başkanlığı	Genel Temizlik		5
10	Eruh Meslek Yüksekokulu	Genel Temizlik		2
11	Kurtalan meslek Yüksekokulu	Genel Temizlik		3
12	Veteriner Fakültesi	Genel Temizlik		2
13	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Genel Temizlik		2
14	Teknik Bil.MYO Kütüphane	Genel Temizlik		3
15	Sosyal Bil.MYO	Genel Temizlik		2
16	Sağlık Hizmetleri MYO	Genel Temizlik		1
17	Yabancı Diller MYO	Genel Temizlik		1
18	Yeşil Alan Müdürlüğü	Genel Temizlik		2
19	El Sanatları Müdürlüğü	Kilim Ustası		3
	TOPLAM			80

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Birim/Bölüm Adı	2011	2012	2013	2014	2015
Eğitim Fakültesi	2.043	2.060	2.081	2034	1987
Fen-Edebiyat Fakültesi	288	255	255	345	571
Mühendislik-Mimarlık Fak.	112	130	204	318	461
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi			188	349	464
İlahiyat Fakültesi			203	457	681
Ziraat Fakültesi			26	49	81
Veteriner Fakültesi				41	91
BESYO				40	191
Sağlık Yüksekokulu	544	450	559	462	476
Sağlık Hizmetleri MYO	176	189	328	632	844
Teknik Bilimler MYO					1092
Sosyal Bilimler MYO					1316
Kurtalan MYO	138	143	181	396	530
Eruh MYO	96	78	89	145	186
Sosyal Bilimler Enstitüsü			53	87	133
Fen Bilimleri Enstitüsü	2	3	36	108	243
Pedagojik Formasyon			265	840	802
TOPLAM	5.147	5.085	6.201	8293	10149

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Değişim Tablosu

	2011	2012	2013	2014	2015
Ön lisans	2.158	2.187	2.331	3203	3968
Lisans	2.987	2.895	3.516	4072	5003
Yüksek lisans	2	3	89	169	366
Doktora					10
TOPLAM	5147	5085	5936	7444	9347

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Akademik Programlar

Faal / Faal Olmayan Programlar	
Faal Olan Programlar	Faal Olmayan Programlar (Kurulmuş Olup Ancak Faaliyete Geçmeyen Programlar)
Sınıf Öğretmenliği (N.Ö.)-(İ.Ö.)	Resim-İş Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N.Ö.)-(İ.Ö.)	Müzik Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği	Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği	Fizik Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği	Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türkçe Öğretmenliği	Arkeoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü	Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Tarih Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.)	Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü	Çevre Mühendisliği
Kimya Bölümü	Maden Mühendisliği
Biyoloji Bölümü	Jeoloji Mühendisliği
Coğrafya Bölümü	Makine Mühendisliği
Gıda Mühendisliği	Mekatronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği	İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği	Mimarlık Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (N.Ö.)-(İ.Ö.)	Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İşletme Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.)	Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
İktisat Bölümü (N.Ö.)-(İ.Ö.)	İç Mimarlık Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü	Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bitki Koruma	
Bahçe Bitkileri Bölümü	Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İlahiyat Bölümü (N.Ö.)(İ.Ö.)	Ekonometri Bölümü
Hemşirelik Bölümü (N.Ö.)(İ.Ö.)	Uluslararası İlişkiler Bölümü
Veteriner Bölümü	Maliye Bölümü
Spor Yöneticiliği (N.Ö) (İ.Ö)	
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği	Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (N.Ö.)(İ.Ö.)	Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (N.Ö.)(İ.Ö.)	Zootekni Bölümü
Elektrik (N.Ö.)(İ.Ö.)	
Makine (N.Ö.)(İ.Ö.)	Bitki Besleme ve Toprak Bilimi Bölümü
Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö.)(İ.Ö.)	Tarım Ekonomisi
Çocuk Gelişimi (N.Ö.)(İ.Ö.)	Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Bilgisayar Programcılığı (N.Ö.)(İ.Ö.)	Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Makine-Resim-Konstrüksiyon	Antrenörlük
Kimya Teknolojisi	
Geleneksel El Sanatları	Rekreasyon
Gıda Teknolojisi (N.Ö.)(İ.Ö.)	Çağrı Merkezi Hizmetleri
İnşaat Teknolojisi	Yapı Denetimi
İşletme Yönetimi (N.Ö.)(İ.Ö.)	İş Güvenliği ve Sağlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (N.Ö.)(İ.Ö.)	Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö.)(İ.Ö.)	Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
İlk ve Acil Yardım (N.Ö.)(İ.Ö.)	İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (N.Ö.)(İ.Ö.)	Otomotiv Teknolojisi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (N.Ö.)(İ.Ö.)	Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Posta Hizmetleri (N.Ö.)(İ.Ö.)	Yaşlı Bakımı (Sağlık Hizmetleri M.Y.O.)
Turizm ve Seyahat Hizmetleri	Diş Protez Teknolojisi
Maliye (N.Ö.)(İ.Ö.)	Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Bankacılık ve Sigortacılık	Fizyoterapi
Dış Ticaret	Harita ve Kadastro
Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi	Yaşlı Bakımı (Eruh M.Y.O.)
Organik Tarım	Çocuk Gelişimi (Eruh M.Y.O.)
Süt Ürünleri Teknolojisi	İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Yüksekokulu)
Sosyal Hizmetler (N.Ö.)(İ.Ö.)	Sosyal Hizmet Bölümü (Sağlık Yüksekokulu)

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı				
Programı	Yüksek Lisans Yapan Sayısı		Doktora Yapan Sayısı	Toplam
	Tezli	Tezsiz		
Bahçe Bitkileri A.B.D	27	0	0	27
Kimya Mühendisliği A.B.D	17	0		17
Matematik A.B.D	30	0		30
Zeotekni A.B.D Ortak	9	0		9
Tarih A.B.D	10	0		10
Türk Dili ve Edeb. A.B.D	8	0		8
Biyoloji A.B.D	21	0		21
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans	6	0		6
Elektrik-Elektronik Mühendisliği A.B.D	23	0	5	28
Gıda Mühendisliği A.B.D.	8	0		8
Kimya A.B.D	29	0		29
Tarla Bitkileri A.B.D	26	0	5	31
Tarla Bitkileri A.B.D Ortak Yüksek Lisans	16	0		16
Zootekni A.B.D	21	0		21
Eğitim Programı ve Öğretimi A.B.D	28	0		28
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi A.B.D	26	0		26
İktisat A.B.D	36	0		36
Türkçe Eğitimi A.B.D	25	0		25
TOPLAM	366	0	10	376

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri												
Birimi	2012 Yılı			2013 Yılı			2014 Yılı			2015 Yılı		
	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam	Kız	Erkek	Toplam
Eğitim Fakültesi	0	0	0	2	0	2	8	10	18	8	16	24
Fen-Edebiyat Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi	0	0	0	0	0	0	1	17	18	5	42	47
İlahiyat Fakültesi	0	0	0	0	0	0	9	27	36	16	27	43
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	0	0	0	0	0	0	3	13	16	2	21	23
Ziraat Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2
Veteriner Fakültesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Sağlık Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	8	22
Sosyal Bilimler MYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
Teknik Bilimler MYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6
Kurtalan Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eruh Meslek Yüksekokulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fen Bilimleri Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	28	31
Sosyal Bilimler Enstitüsü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Pedagojik Formasyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	2	0	2	13	149	129	217	164	217

Üniversitemiz Sporda Başarıdan Başarıya Koşuyor



Üniversitemiz merkez yerleşkede 400 kişilik konferans salonu, kamelyada 80 kişilik çok amaçlı salon ve Mühendislik Mimarlık Fakültesinde 250 kişilik konferans salonlarında toplantı, sempozyum, konferans, tiyatro, konser ve diğer etkinlikler yapılmakta olup, öğrenci ve akademisyenlerimizin sık kullandığı yerlerdir. Bahar şenliğinde hafta boyunca ünlü sanatçıların yer aldığı konserler, öğrenci gruplarının düzenlediği gösteriler ve çeşitli spor dallarında turnuvalar düzenlenmekte, mezuniyet töreni ve aşure günü etkinlikleri yapılmaktadır. Üniversitemizde bulunan 26 öğrenci kulübü akademik danışmanları gözetiminde kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

BAP Koordinatörlüğünde 2015 Yılında;

- 30 adet yüksek lisans tez projesi ile 14 adet araştırma projesi desteklenmiştir.
- 2011 - 2014 Döneminden devam eden 15 adet proje tamamlanmıştır.
- Proje sonucunda yayımlanan makale sayısı 3, bildiri sayısı 5 olmuştur.

Yıllar İtibariyle BAP Birimince Desteklenen Proje Sayıları				
	2012	2013	2014	2015
Proje Sayısı	10	24	17	44
Proje Tutarı	111.000,00	473.703,931	129.307,00	358.032,27

BAP Projeleri Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar					
Ekonomik Kod				Ekonomik Sınıflandırmanın Adı	2015 Yılı Harcama Tutarı
I	II	III	IV		
03	02			Tüketim Malzemesi	131.735,96
03	03			Harcırah	7.719,38
03	05			Hizmet Alımı	41.136,45
03	07			Demirbaş	84.670,56

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz 2015 Yılı Gelir Bütçesi

AÇIKLAMA	YIL	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN/ PLANLANAN (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2014	1.267.000	2.085.265	164,58
	2015	1.122.000	2.936.279	261,70
HAZİNE YARDIMI	2014	51.171.000	67.779.702	132,46
	2015	62.031.000	75.418.910	121,58
DİĞER GELİRLER	2014	985.000	2.426.248	246,32
	2015	1.095.000	1.617.797	147,74
TOPLAM GELİRLER	2014	53.423.000	72.291.215	135,32
	2015	64.248.000	79.972.986	124,48

2.6- 2015 Yılı Yatırımları ile Hedeflenen ve Gerçekleşen Hedefler


Üniversitemiz 2015 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş ve spor sektöründe bir proje yer almaktadır. Bu projelerle Üniversitemizin fiziki mekan inşaatı, sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir. Birimlerin Makine Teçhizat ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır.

S.No	İHALE ADI	İhale Tarihi	İhale Türü	İhale Usulü	Sözleşme Tutarı
1	160 Kalemde Oluşan Mobilya/Mefruşat Alımı	03.06.2015	Mal	21/B	498.000,00
2	32 Kalemde Oluşan Donanım Malzemesi Alımı	10.06.2015	Mal	Açık	378.000,00
3	30 Kısımdan Oluşan Lab. Cihaz Alımı	15.06.2015	Mal	Açık	130.885,00
4	Perde Alımı	31.08.2015	Mal	Açık	59.990,00
5	Microsoft Alımı	08.10.2015	Mal	Açık	97.250,00



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

TAŞITIN CİNSİ	BÜTÇE
Binek	8
Arazi Binek	1
Otobüs (Sürücü dahil en az 26 kişilik)	3
Panelvan	1
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	2
Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	1
Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	2
Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlık 3501 kg.	1
Traktör	4
TOPLAM	23

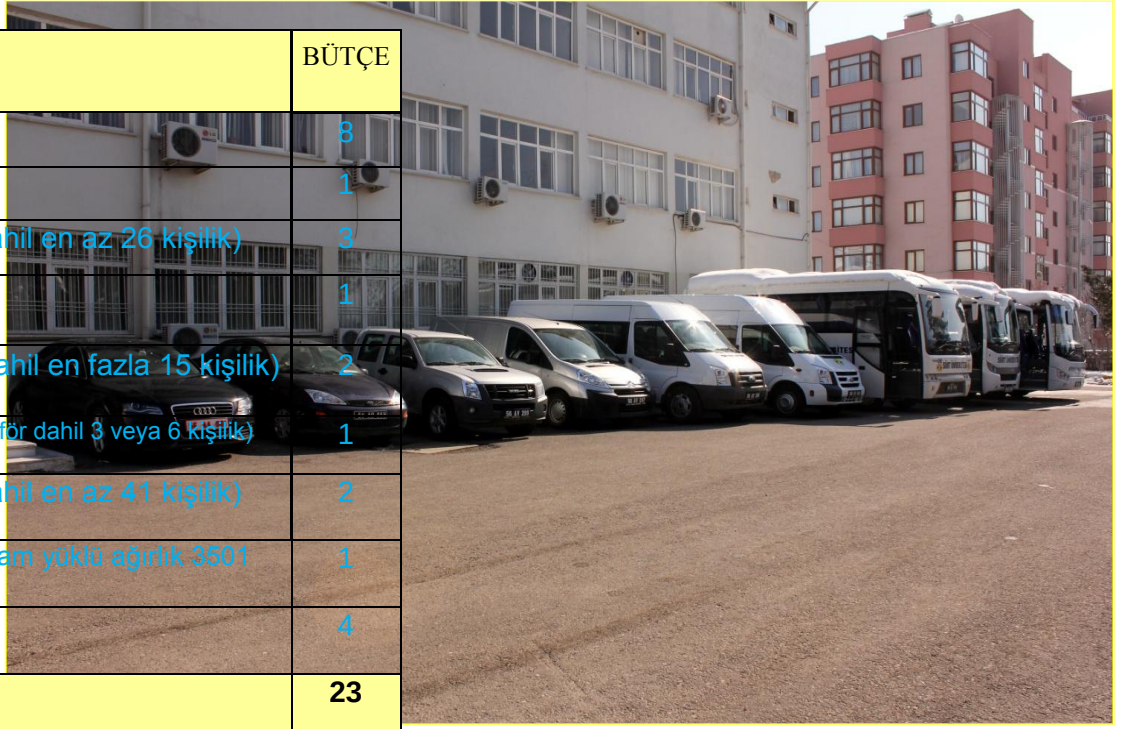

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Bazında Yapılan İşler

Çeşitli İşler Etüt Projesi		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi Arasında Kalan Otopark ve Isı Merkezi Yanındaki Boş Alanın Peyzaj Proje Çizim İş	16.520,00	SIİRT

Kampus Alt Yapısı		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
İhata Duvarı Korkuluk, Trafo Aydınlatma, Fiberoptik ve Kanalizasyon Yaptırılması	625.840,14	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Isı Merkezi, Kazan Daireleri ve Lojman Binaları Doğalgaz Dönüşüm İş	707.033,64	SIİRT
Kezer Yerleşkesine Doğalgaz Bağlantı Hattı Çekim İş	1.541.876,91	SIİRT
Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme Yapım İş	194.700,00	SIİRT

Derslik ve Merkezi Birimler		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Ziraat Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İş	1.546.128,55	SIİRT
Veterinerlik Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Yapım İş	564.346,12	SIİRT
Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İş	11.503.164,89	SIİRT
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İş	3.750.262,66	SIİRT
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İş	5.356.446,03	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İş	765.424,02	SIİRT

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Büyük Onarım		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu ve Merkez Kampus İhata Duvarı Üstündeki Korkuluklara Jiletli Tel Çekim İşİ	11.785,84	SIİRT
Üniversitemizin Muhtelif Binalarında Kapı Pencere Bakım Onarım İşİ	2.360,00	SIİRT
Üniversitemiz Merkez Kampusunda Bulunan Çevre Aydınlatmasının Bakım Onarım İşİ	9.558,00	SIİRT
Kezer Kampusu Ana Isı Merkezindeki 3 Adet Pompanın Arızasını Gidermek İçin Pompa Keçesi Değişimi ve Hidrofor Bakım Onarımının Yapılması ve Müh. Mim. Fak.B Blok Etrafında Bulunan 4 Adet Dalgıç Pompanın Bakım İşİ	8.968,00	SIİRT
Lojman Isı Merkezinde Bulunan Panjurlu Pencerelerin Sökülüp PVC Doğrama ile Değiştirilmesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi A, C Bloklarında ve Fen Edebiyat Fakültesi B Bloкта Bulunan Görüntü Kayıt Sistemlerine Alüminyum Doğrama ile Oda Yapılması İşleri	17.405,00	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Isı Merkezi Hidrofor Tamiri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi A Blok ve Sosyal Tesis Binası Pis Su Çukur Pompaları Tamiri ve Mühendislik Fakültesi C Blok Sirkülasyon Pompası Tamiri İçin 6 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı	15.564,20	SIİRT
Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Alt Yapısı İçin 44 Kalem Polietilen Malzeme Alım İşİ	17.294,75	SIİRT
Üniversitemize Bağlı Binaların Kazan Brülörlerinin Bakım ve Onarımı (8 Adet)	13.620,74	SIİRT
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bakım Onarım İşİ Kesin Hakedişi	62.422,00	SIİRT
Siirt Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Merkezi UPS PanoYapımı, Tesisat Çekimi ve Topraklama Güçlendirme Yapılması İşİ	19.080,60	SIİRT
3 Kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı	13.298,60	SIİRT
Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi Lojman Güvenlik Kulübesi Yapım İşİ	46.680,62	SIİRT
Elektrik Malzemeleri Alımı	15.274,60	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Turizm ve Spor Eğitim Merkezi Otoparkına Otomatik Kapı Takılması İşİ	6.490,00	SIİRT
Eğitim Fakültesi A Blok İdari Bölümüne Çay Ocağı Yapılması İşİ	8.850,00	SIİRT
Rektörlük Konutu Havuz Etrafının Panel Çimşit ile Çevrilmesi	13.658,50	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine Yangın Merdiveni ve Çıkış Kapısı Yapım İşİ	19.706,00	SIİRT
Fen Edebiyat Fak. Z-33 Nolu Lab. El Sanatları Atölyesine Dönüşmesi İçin Alüminyum Doğrama Yapılması	17.110,00	SIİRT
Üniversitemiz Rektörlük Binası A Blok Çay Ocağı Yapılması	19.198,60	SIİRT
Rektörlük Konutu Havuz Etrafına Alüminyum Korkuluk Yapılması	3.662,72	SIİRT
Rektörlük Binaları A ve B Bloklarda Bulunan G. Sekr. ve Başkan Odalarına Kapı Açılması ve Alçıpan Yapılması	13.444,92	SIİRT
Kezer. Yerl. Yol Güzergahında 1+900 KM sağ Kısmında Bulunan Bölgedeki Yeşil Alanın Artırılması ve Aynı Kampus Alanının Sol Kısmında Toprak Taşınması ve Tasfiye Yapılması	17.995,00	SIİRT
Kezer Yerleşkesinde Bulunan Lojmanların Hava Alanı ile Bağlantısını Sağlayan Yolda yer Alan Ana Giriş Kapısının Otomatik Raylı Yapılması	19.470,00	SIİRT
Muhtelif Yerlerde Bulunan Yağmursuyu Hatlarının Tadilatları ve Izgara Yapılması	15.930,00	SIİRT
Eruh MYO Kazan Değişimi Yapım İşİ	47.200,00	SIİRT
Rektörlük Konutunda Barbekü Yerinin Yan Tarafına Lavabo Yapılması	18.585,00	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Rektörlük Binası B Bloкта 1 Odanın Çay Ocağına Dönüşümü	7.965,00	SIİRT
Rektörlük B Blok Giriş Kısmına Güvenlik ve Danışma İçin Alüminyum Doğramadan Bölme Yapılması	2.360,00	SIİRT
Rekt. Binası B Bloktan A Blok ve Merk. Kafeterya. Binalarına İnternet Swich Çekilmesi	19.139,60	SIİRT
Rektörlük A Blok Giriş Kapısına Fotoselli Kapı Yapılması	10.384,00	SIİRT
Veteriner Fak. ve MYO Hizmet Binasına Deprem Raporu Hazırlanması İşİ	11.800,00	SIİRT
Kapalı Spor Salonunda Kabarmış Parkelerin ve Alt Izgaraların Yenilenmesi İşİ	6.864,00	SIİRT
Üniversitemiz Ziraat Fak. Deposunun Kepenk Sist. Bakım Onarımı	413,00	SIİRT
MYO ile Bildircin Ünitesi Arasındaki Isıtma Tesisatının Yenileme İşİ	5.310,00	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Lojman Kanalizasyon Hattı Onarım İşİ	14.160,00	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Konukevine Yakıt Tankerinin Ulaşımı İçin Stabilize Malzeme Serim İşİ	11.233,60	SIİRT
Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Arasında Kalan Otopark ve Isı Merkezi Yanındaki Boş Alanın Peyzaj Proje Çizim İşİ	15.222,00	SIİRT

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Lojman ve Sosyal Tesis		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İş	1.523.204,82	SIİRT

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Yapılan İşin Adı	Harcama Tutarı	İşin Yapıldığı Yer
Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İş	997.177,67	SIİRT

Muhasebe Biriminin	Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi													KURUM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : 12		Bütçe Yılı 2015	
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ			
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV									
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1			0	Mamul Mal Alımları	3.628.982,15	3.628.982,15	0,00	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	0	0	0	Mamul Mal Alımları	3.628.982,15	0,00					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	1	1	Büro Mefruşatı Alımları	0,00	1.211.576,59					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	1	4	Hastane Mefruşatı Alımları	0,00	8.826,40					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	1	5	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	0,00	41.341,30					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	1	1	90	Diğer Mefruşat Alımları	0,00	639.429,56					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	1	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	0,00	59.684,40					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	2	Bilgisayar Alımları	0,00	4.661,00					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	4	Laboratuar Cihazı Alımları	0,00	97.538,80					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	5	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0,00	34.626,83					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	2	2	90	Diğer Makine Teçhizat Alımları	0,00	804.301,65					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	1	4	1	1	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0,00	726.995,62					
KURUM TOPLAMI :														3.628.982,15	3.628.982,15	0,00	0,00				

Muhasebe Biriminin	Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi												KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI		Ait Olduğu Ay : 12 Bütçe Yılı 2015		
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV					
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3			Gayri Maddi Hak Alımları	135.852,90	135.852,90	0,00	0,00
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	0	0	Gayri Maddi Hak Alımları	135.852,90	0,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	1	1	Bilgisayar Yazılımı Alımları	0,00	114.755,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	3	3	1	Lisans Alımları	0,00	21.097,90		
KURUM TOPLAMI :														135.852,90	135.852,90	0,00	0,00

Muhasebe Biriminin		Kodu: 56756 Adı : Siirt Üniversitesi		KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI				Ait Olduğu Ay : 12 Bütçe Yılı 2015									
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5			Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.075.605,44	29.075.605,44	0,00	0,00
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	0	0	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.075.605,44	0,00		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	1	90	Diğer Giderler	0,00	1.332.873,78		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	4	90	Diğer Enerji Alımları	0,00	1.541.876,91		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	1	Hizmet Binası	0,00	22.921.426,15		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	2	Hizmet Tesisleri	0,00	1.561.523,79		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	3	Lojmanlar	0,00	1.523.204,82		
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	5	7	90	Diğerleri	0,00	194.699,99		
KURUM TOPLAMI :														29.075.605,44	29.075.605,44	0,00	0,00

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Muhasebe Biriminin		Kodu: 56756		KURUMU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI										Ait Olduğu Ay : 12				
		Adı : Siirt Üniversitesi												Bütçe Yılı 2015				
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİN. TİPİ		EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	ALINAN ÖDEME EMİRLERİ	HARCAMALAR TOPLAMI	KULLANILABİLİR ÖDENEK	ÖDENEKÜSTÜ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV							
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7			Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	596.200,89	596.200,89	0,00	0,00	
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	0	0	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	596.200,89	0,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	1	1	Proje Giderleri	0,00	16.520,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	1	90	Diğer Giderler	0,00	184.513,06			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	2	1	İnşaat Malzemesi Giderleri	0,00	13.298,60			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	2	2	Elektrik Tesisatı Giderleri	0,00	15.274,60			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	2	3	Sihhi Tesisat Giderleri	0,00	32.858,95			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	7	1	Hizmet Binası	0,00	109.102,62			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	7	2	Hizmet Tesisleri	0,00	7.080,00			
38	73	0	1	9	4	1	0	2	6	7	9	1	Diğer Giderler	0,00	217.553,06			
KURUM TOPLAMI :														596.200,89	596.200,89	0,00	0,00	

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhaleler ve Sözleşme Bedelleri					
İşin Adı	2011	2012	2013	2014	2015
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yapım İşi	-	1.684.000,00	-	-	-
Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi	-	2.009.000,00	-	-	-
Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Yapım İşi	10.745.000,00				
Kapalı Spor Salonu Yapım İşi	-	1.820.000,00	-	-	-
Siirt Üniversitesi Ana Kampus Giriş Düzenleme yapım İşi	-	385.000,00	-	-	-
Kezer Yerleşkesi Kampus Yolları Asfalt Kaldırım Hendek ve İstinat Duvarları	-	-	2.640.000,00		
Merkezi Kafeterya, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	-	-	18.540.000,00	-	
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi	-	-	10.740.000,00	-	
1000 seyirci Kapasiteli Sentetik Yüzeyle Atletizm Pistli Futbol Sahası Yapım İşi	-	-	2.380.000,00	-	-
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenlemeleri Yapım İşi	-	-	8.950.000,00	-	-
Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İşi	-	-	-	1.850.000,00	-
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	-	-	-	5.800.000,00	-
Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri	-	-	-	1.180.000,00	
37 Daireli Lojman Doğalgaz Tesisatı Çekilmesi ve Kombi Takılması İşi	-	-	-	89.000,00	-
Rektörlük Binası ve Siirt MYO Kalorifer Kazanları Doğalgaz Dönüşüm İşleri	-	-	-	205.000,00	-
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Ahır Yapım İşi					495.000,00
Kezer Yerleşkesi Isı Merkezleri, Kazan Daireleri ve Lojman Binaları Doğalgaz Dönüşüm İşi					576.000,00
Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Kalorifer Kazanı Yenileme İşleri					40.000,00
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İhata Duvarı, Korkuluk İşleri, Trafo, Aydınlatma, Fiberoptik ve Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi					549.000,00
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Lojman Güvenlik Kulübesi Yapım İşi					43.500,00
Kezer Yerleşkesi Rektör Konutu Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşleri					150.000,00
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım İşi					129.000,00
İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi					17.321.000,00
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Bakım Onarım İşi					52.900,00
Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi					13.507.000,00
TOPLAM	10.745.000,00	5.898.000,00	43.250.000,00	9.124.000,00	32.863.400,00

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2.7- 2015 Yılı Yatırım Hedefleri

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi ile yatırımlar için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmış olup, ödenek üstü harcama yapılmamıştır. Maliye Bakanlığında yıl içinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden gönderilen 5.000.000,00 TL ile birlikte Eğitim sektörü projelerine 9.114.000,00 TL likit karşılığı olmak üzere toplam 14.114.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli	Program Yılı Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı(%)
Eğitim	6	143.083.000	22.000.000	14.114.000		36.114.000	32.454.564,27	89,87
Spor	1	7.000.000	1.000.000			1.000.000	997.177,67	99,72

YILLARA SARI İŞLER PROJE BİLGİLERİ TABLOSU									
İşin Adı	Proje Adı	Proje No	İhale Tarihi	İhale Şekli	Sözleşme Tarihi	Yüklenici Firma	Sözleşme Bedeli	2015 Yılı Gerçekleşme Yüzdesi	İnşaat m²
Alt Yapı 1. Etap İnşaatı Yapım İşi	Kampus Alt Yapısı	2009H032260	29.09.2010	AÇIK	05.01.2011	DEMİR İnş. Altyapı San. Tic. Ltd. Şti. ve MALAMİRA İnş. Sondaj Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi	7.485.000,00	%100	
Ana Kampus Giriş Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	Kampus Alt Yapısı	2009H032260	24.08.2012	AÇIK	25.09.2012	HAŞEMOĞLU İnş. Gıda Nak. Turizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.	385.000,00	%100	
Kampus Yolları Asfalt Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarları Yapılması İşi	Kampus Alt Yapısı	2009H032260	02.05.2013	AÇIK	03.06.2013	Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayv. San. Tic. A.Ş.	2.640.000,00	%100	
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H032270	11.10.2013	AÇIK	29.11.2013	Asmin Mimarlık Mühendislik İnş.Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	1.850.000,00	%100	11.325 m²
Fen Edebiyat Fak. İnşaatı Yapım İşi	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H032270	09.05.2011	AÇIK	11.07.2011	Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.	10.745.000,00	%100	14.223 m²
Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	Derslik ve Merkezi Birimler	2009H032270	13.05.2013	AÇIK	06.06.2013	Bablılar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayvancılık Tic. San. A.Ş. Ortak Girişimi	18.540.000,00	% 100	12.250m² 10.400 m²
Sosyal Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım İşi	Lojman ve Sosyal Tesis	2009H032280	07.05.2012	AÇIK	27.06.2012	Özbar Elektrik Nak. İnş. Tem. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.	2.009.000,00	%100	3.565 m²
Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu İnşaatı Yapım İşi	Lojman ve Sosyal Tesis	2009H032280	28.03.2013	AÇIK	08.05.2013	Sağır İnş. Gıda Teks. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. & Keskinler İnş Gıda İçecek Tar. Hayv. Tic. San. A.Ş. Ortak Girişimi	10.740.000,00	%100	19.054 m²
Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H050220	10.05.2012	AÇIK	23.08.2012	Keskinler İnş. Gıda İçecek Tarım Hayv. San. Tic. A.Ş.	1.820.000,00	%100	3.320 m²
1000 Seyirci Kapasiteli Sentetik Çim Yüzeyli Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı Yapım İşi	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010H050220	07.06.2013	AÇIK	05.07.2013	Cihan – Er Müh. Nak. İnş. Taah. Harf. Temizl. San. ve Tic. Ltd. Şti.	2.380.000,00	%100	22.000 m²

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2015 Yılı Yapım İşleri Proje Bilgileri Tablosu						
İşin Adı	İhale Tarihi	İhale Şekli	Sözleşme Tarihi	Yüklenici Firma	Yaklaşık Maliyet	Sözleşme Bedeli
Ziraat Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşİ	27.04.2015	AÇIK	21.05.2015	Martı Konut Gıda.Teks. Pet Ür.İnş. Elektr. Müh. Hayv. Oto.san. ve Tic. Lmtđ. Şti.& Haşemoğlu İnşaat Gıda Nakliyat Turizm Tic.San. ve Lmtđ. Şti. Ortak Girişimi	17.820.087,93	13.507.000,00
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uyg. Çiftlik İnşaatı Yapım İşİ	09.04.2015	AÇIK	30.04.2015	Haşemoğlu İnşaat Gıda Nakliyat Turizm Tic.San. ve Lmtđ. Şti.	509.318,37	495.000,00

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen ihale ilan ve itiraz süreleri ihale sürecinin uzamasına neden olmakta ve bu durum hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin KPSS ile işe başlayan genç ve tecrübesiz olması, nitelik ve sayısının yetersiz olması ile mevzuat konusundaki yetersizliği işlemleri olumsuz yönde etkilemektedir.
- Üniversitede çalışan idari personele de geliştirme ödeneği verilmemesi motivasyon ve kurum aidiyet duygusunu olumsuz etkilemektedir.
- Bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması.
- Bölgenin olumsuz şartları nedeni ile ihalelere katılmak isteyen yatırımcı sayısının yetersiz olması.

III- ÜNİVERSİTEMİZ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

3.1- 2015H034710 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim
Proje No	2015H034710
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP)
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Bedeli	100.000,00 TL
Eklenen Ödenek	0 TL
Yılı Ödeneği	100.000,00 TL
Yılı Harcaması	16.520,00 TL
Kalan Ödenek	83.480,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%16,52
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%16,52
AÇIKLAMALAR:	
- Kezer Yerleşkesi Sosyal Tesis, Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında kalan boş alanın peyzaj proje çizim işi yapılmıştır.	

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.2- 2015H034720-2015H034730 Muhtelif İşler-Yayın Alımı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2015H034720-2015H034730	
Projenin Adı	Muhtelif İşler-Yayın Alımı	
Harcamayı Yapan	Yapı İşleri ve Tek.Daire Bşk., İMİD Daire Bşk. ile Kütüphane ve Dök. Daire Bşk.	
Proje Bedeli	2.898.000,00 TL	
Eklenen Ödenek	3.744.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	6.642.000,00 TL	
Harcama	4.376.136,50 TL	
Kalan Ödenek	2.265.863,50	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%65,89	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%65,89	
İşin Adı	Proje Adedi	2015 Harcama Tutarı
Büyük Onarım-Proje Tutarı 500.000 TL	1	596.200,89 TL
Makine Teçhizat ve Taşıt Alımı	1	3.628.982,15 TL
Kütüphane Yayın Alımı- Proje Tutarı 400.000 TL	1	15.100,56 TL
Bilgi Teknolojileri-Proje Tutarı 200.000 TL	1	135.852,90 TL
AÇIKLAMALAR:		
- Büyük bakım onarım işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. - İMİD Başkanlığı tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere taşıt, makine, teçhizat, eğitim donanımı ile büro mobilyaları alınmıştır. - Çeşitli birimlerin yazılım ihtiyaçları İMİD Başkanlığı bütçesinden satın alınmıştır. - Yıl içinde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında Kalkınma Bakanlığından gönderilen 1.500.000,00 TL ile birlikte likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.3- 2009H032260 Kampüs Altyapısı (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032260	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	25.00.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	16.401.423,59 TL	
2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	3.000.000,00 TL	
Yıl içinde Eklenen Ödenek	0 TL	
Yılı Ödeneği	3.000.000,00 TL	
Yılı Harcama	3.069.450,69 TL	
Kalan Ödenek	-69.450,69 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%102,32	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%77,88	
İşin Adı	Adedi	2015 Harcama Tutarı
İhata Duvarı Korkuluk, Trafo Aydınlatma Fiberoptik ve Kanalizasyon Yaptırılması İş	1	625.840,14
Kezer Yerleşkesi Isı Merkezleri Kazan Daireleri ve Lojman Binaları Doğalgaz Dönüşüm İş	1	707.033,64
Kezer Yerleşkesine Doğalgaz Bağlantı Hattı Çekim İş.	1	1.541.876,91
Rektörlük Konutu Çevre Düzenleme Yapım İş	1	194.700,00



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.4- 2009H032270 Derslik ve Merkezi Birimler (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032270	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	95.000.000.00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	56.891.824,91 TL	
2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	15.600.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	8.820.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	24.420.000,00 TL	
Yılı Harcaması	23.485.772,27 TL	
Kalan Ödenek	934.227,73 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%96,17	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%84,61	
İşin Adı	Adedi	2015 Harcama Tutarı
Ziraat Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	1	1.546.128,55
Merkezi Kafeterya Binası,Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	1	11.503.164,89
Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi	1	3.750.262,66
Sağlık Merkezi İnşaatı Yapım İşi	1	765.424,02
Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme İnşaatı Yapım İşi	1	5.356.446,03
Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Yapım İşi	1	564.346,12
AÇIKLAMALAR: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 5.230.000,00 TL likit karşılığı ve 3.500.000,00 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneği olmak üzere toplam 8.820.000,00 TL ödenek eklenmiştir.		

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.5- 2009H032280 Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)

Sektörün Adı	Eğitim	
Proje No	2009H032280	
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	20.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	18.303.157,26 TL	
2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	1.550.000,00 TL	
Yılı Ödeneği	1.552.000,00 TL	
Yılı Harcaması	1.523.204,82 TL	
Kalan Ödenek	166.708,48 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%98,14	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%99,13	
İşin Adı	Adedi	2015 Harcama Tutarı
Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşİ	1	1.523.204,82
AÇIKLAMALAR: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca likit karşılığı ödenek eklenmiştir.		



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

3.6- 2010H050220 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sektörün Adı	Spor	
Proje No	2010H050220	
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Proje Bedeli	7.000.000,00 TL	
Önceki Yıllar Harcaması	5.672.344,29 TL	
2015 Yılı Bütçesi Başlangıç Ödeneği	1.000.000,00 TL	
Yıl İçinde Eklenen Ödenek	0 TL	
Yılı Ödeneği	1.000.000,00 TL	
Yılı Harcaması	997.177,67 TL	
Kalan Ödenek	2.822,33 TL	
Nakdi Gerçekleşme Oranı	%99,72	
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%95,28	
İşin Adı	Adedi	2015 Harcama Tutarı
Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İşi	1	997.177,67

TAMAMLANAN PROJELER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yapım İşİ

Fakültemiz 3 blok ve 1 adet ısı merkezinden oluşmakta olup 21.000 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 22 adet derslik, 38 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu ve 46 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır. Fakültemiz 16.373.646,56 TL + KDV ile tamamlanmıştır.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Fen Edebiyat Fakültesi Yapım İşi

Fakültemiz 2 bloktan oluşmakta olup 14.250 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 24 adet derslik, 22 adet laboratuvar, 2 adet konferans salonu ve 41 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulundurmaktadır. Fakültemiz 12.262.625,32,00 TL + KDV ile tamamlanmıştır.



Eğitim Fakültesi Yapım İşi.

Eğitim Fakültesi 2 blokta oluşmakta olup 11.325 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 23 sınıf, 7 laboratuvar, 1 konferans salonu, 4 tane toplantı salonu ile 40 adet öğretim elemanı odası ve ofis bulunmaktadır. Fakültemiz 9.696.588,75 TL+KDV bedel ile tamamlanmış olup 2015 yılında eğitim öğretim faaliyeti başlamıştır.



Merkezi Kafeterya Binası, Rektörlük Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi

Kezer Yerleşkesinde iki bloktan oluşan Rektörlük Binası 10.400 m² kapalı alana sahip Merkezi Kafeterya Binası ise 12.250 m² kapalı alana sahiptir. Rektörlük Binası bünyesinde 124 ofis, 2 toplantı odası, 1 sığınak ve 37 tane depo bulunmaktadır. Yapım işi 19.498.327,84 bedel ile tamamlanmış olup 2015 yılında faaliyete geçmiştir.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Kampüs Alanı Çevre İhata Duvarı ve Koruma Çiti Yapılması

Satın alınan şahıs arazileri ile üniversitemize tahsis edilen arazilerin bütünlüğünü sağlamak için kampüs sınırına 10.500 mt'lik betonarme duvar ile tel kafes yapılmıştır. Bu imalatın 1800 metrelik kısmı betonarme duvar, geri kalan kısmı ise betonarme direkli tel kafes şeklindedir. Projemiz 869.796,07 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.




Kampüs Altyapısı 1. Etap İnşaatı Yapım İşİ

Bu proje kapsamında tüm yolların kaldırım ve asfalt imalatları haricinde, atık su, yağmur suyu, elektrik imalatları ve 6 adet trafo merkezi yapılacaktır. Yüzde 10'luk keşif artışı kapsamında 4500 kişilik arıtma tesisi yapılmıştır. Proje 9.408.897,12 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

Kezer Yerleşkesi Kampüs yolları Asfalt, Kaldırım, Hendek ve İstinat Duvarları Yapım İşİ

Bu proje kapsamında Üniversitemizce ana güzergâh olarak belirlenen yolların asfalt, kaldırım, hendek ve istinat duvarları çalışmaları yapılmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Proje 2.601.315,86 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.

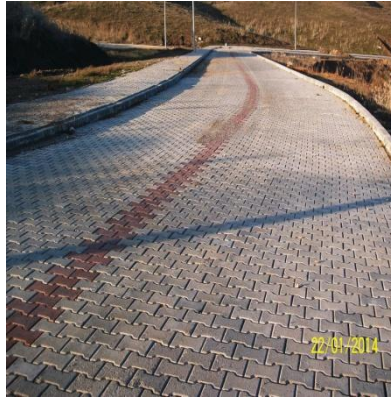

Kezer Yerleşkesi İhata Duvarı, Korkuluk İşleri, Trafo, Aydınlatma, Fiberoptik ve Kanalizasyon Hattı Yapılması İşİ

Kezer Yerleşkesinde 2010 yılında yapılan ihata duvarının üzerine parmaklıklar ve üzerine çit yapılması, ışıklandırma yapılması, 2000 m fiberoptik altyapısının yapılması ve fiberoptik kablo çekilmesi ve 1 adet trafo yapılmıştır. Bu yapım işi 546.776,28 TL + KDV bedel ile yaptırılmıştır.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Lojman İnşaatı Yapım İşi

Şehir Merkezi Lojmanımız 11 adet 3+1, 11 adet 2+1 ve 12 adet stüdyo daireden oluşmaktadır. Lojmanın üst katında 1 adet 2+1 ile 1 adet 3+1 daireden rektörlük konutu ve bu konutun üstünde teras kat oluşturulmuştur. Ayrıca bodrum katında 2 adet 2+1 daire oluşturulmuştur. Projemiz 1.917.880,14 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.




Kezer Yerleşkesi Lojman İnşaatı ve Rektörlük Konutu Yapım İşi

Bu proje kapsamında 100 lojman, Rektörlük Konutu ve Isı merkezi ile altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 11.280.637,38 TL + KDV ile tamamlanmıştır.



Sosyal Tesis İnşaatı Yapım İşi

Bu proje 2010 yılında 2.088.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 2.009.000,00 TL'dir. Bu proje 39 normal oda 2 suit oda olmak üzere toplam 41 oda, 1 yemekhane ve 1 kafeteryadan müteşekkildir.

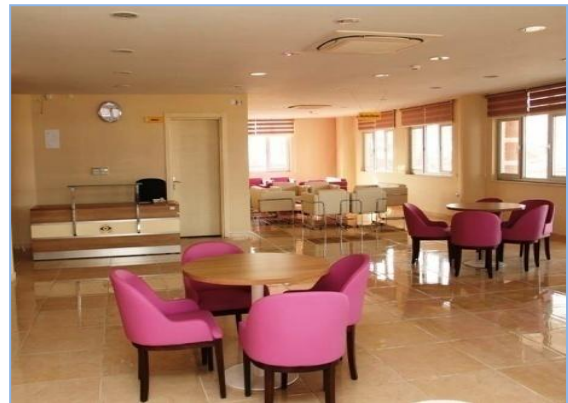

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Soyunma Odaları ve Portatif Tribün Yapılması Yapım İş

Futbol sahası FIFA standartlarına uygun olup 1000 seyirci kapasitelidir ve 4 adet soyunma odasına sahiptir. Projemiz 2.401.136,66 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



1000 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İş

Bu proje 2010 yılında 2.138.000,00 TL sözleşmeye bağlanmış ancak, yüklenici yükümlülüklerini yerine getirmedeğinden sözleşmesi feshedilerek iş 2012 yılında yeniden ihale edilmiştir. İşin yeni sözleşme bedeli 1.820.000,00 TL'dir. Salonumuz 3320 m² kapalı alana sahiptir.



Kezer Yerleşkesi Kapalı Halı Saha, Soyunma Odası ve Açık Spor Tesisleri Yapım İş

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine 1 adet kapalı halı saha, 2 adet açık basketbol, voleybol sahası 2 adet açık tenis kortu ve soyunma odaları yapılmış olup yüklenicinin vefatından dolayı kalan çevre düzenleme işleri yeni bir ihale ile farklı bir yüklenici tarafından üstlenilerek tamamlanmıştır.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Laboratuvar binamız 2.000 m² kapalı alana sahip olup, bünyesinde 14 adet laboratuvar barındırmaktadır. Projemiz 1.702.136,64 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapım İş

Bu proje kapsamında Kezer Yerleşkesi Sağlık Merkezi İnşaatı ve Çevre Düzenleme Yapım İş 1.000 m² kapalı alana sahiptir. 6 adet sağlık odası ve 13 adet ofis yer almaktadır. 1.928.111,98 TL+KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Kezer Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Ahır Yapım İş

Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftlik İnşaatı Ahır Yapım İş Üniversitemizin Veteriner Fakültesinin, hayvanları araştırması ve geliştirmesi için Kezer Yerleşkesinde 493.050,98 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Kampüs Giriş Düzenleme Çalışmaları

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine ana giriş kapısı ve çevre düzenlemesi yapılmıştır. Ana kampüs girişi 388.120,59 TL + KDV bedel ile tamamlanmıştır.



DEVAM EDEN PROJELER

Merkezi Kütüphane Binası ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşİ

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine kütüphane binası yapılacak olup, söz konusu bina 5.560 m² kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 4 adet okuma salonu, 12 adet grup çalışma odası ve 18 adet bireysel çalışma odası bulunmaktadır.



Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Ziraat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine Ziraat Fakültesi binası yapılacak olup, söz konusu bina 13.000 m² kapalı alana sahip olacaktır. %12 si tamamlanmıştır.



İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Yapım İşi

Bu proje kapsamında Üniversitemiz Kezer Yerleşkesine İlahiyat Fakültesi binası yapılacak olup, söz konusu bina 13.000 m² kapalı alana sahip olacaktır. Yapım İşinin 2015 yılında ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2016 yılında sözleşmesi ve yer teslimi yapılmıştır.



IV- ÖNERİLER

Yeni kurulan bir Üniversite olarak öngörülen hedeflerimize ulaşabilmek için bütçe ödeneklerimizin artırılması gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca, Yılı Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin icmal harcama programında kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması uygun olacaktır.

Personelin proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve mevzuat konusundaki yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kurumlara hizmet içi eğitim desteğinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.

Maliye Bakanlığınca onaylanan İcmal Harcama Programı ile Hazine Yardımından karşılanacak ödeneklerin 3 aylık dilimler yerine iki dilim halinde serbest bırakılması verimi artıracaktır.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin tümünü karşılamak üzere ayrı değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

V- EKLER

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

ADI: SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SEKTÖR EĞİTİM

2015 Nakdi

NO (1)	(2)	PROJE NO (3)	PROJE ADI (4)	BÜTÇE TÜRÜ (5)	BİTİŞ YILI (6)	YERİ (7)	PROJE TUTARI		Önceki Yıllar KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2015 YILI ÖDENEĞİ			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZ KAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZ KAYNAK (17)	TOPLAM (18)
1		2015H034710	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Özel	2015	Siirt		100.000,00				100.000,00	+	0			16.520,00
2		2015H034720	Muhtelif İşler (GAP)	Özel	2015	Siirt		2.583.000,00				2.898.000,00	+	3.595.000,00			4.361.035,94
3		2015H034730	Yayın Alımı	Özel	2015	Siirt		400.000,00				400.000,00		149.000,00			15.100,56
4		2009H032260	Kampüs Alt Yapısı (GAP)	Özel	2017	Siirt		25.000.000,00	16.401.423,59			3.000.000,00	+	0			3.069.450,68
5		2009H032270	Derslik ve Merkezi Birimler(GAP)	Özel	2017	Siirt		95.000.000,00	56.891.824,91			15.600.000,00	+	8.820.000,00			23.469.252,27
6		2009H032280	Lojman ve Sosyal Tesis (GAP)	Özel	2016	Siirt		20.000.000,00	18.303.157,26			2.000,00	+	1.550.000,00			1.523.204,82
						TOPLAM		143.080.000,00	91.596.405,86			22.000.000,00		14.114.000,00			32.454.564,27
SEKTÖR ADI		SPOR															
1		2010H050220	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel	2015	Siirt		7.000.000,00	5.672.344,29			1.000.000,00	+	0			997.177,67
						TOPLAM		7.000.000,00	5.672.344,29			1.000.000,00		0			997.177,67
			GENEL TOPLAM					150.080.000	97.268.750,15			23.000.000,00	+	14.114.000,00			33.451.741,94

Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

SIİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: ÖZEL

2015 Yılı Fiyatları

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama		2015 Yılı Program Ödeneği			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme			
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Enerji															
Konut															
Eğitim	6		143.080.000,00			91.596.405,86			22.000.000			36.114.000			32.454.564,27
Spor	1		7.000.000,00			5.672.344,29			1.000.000			1.000.000			997.177,67
TOPLAM	7		150.080.000,00			97.268.750,15			23.000.000			37.114.000			33.451.741,94

SIİRT ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ VAZİYET PLANI



www.siirt.edu.tr
